Projekt Grundschule Grüntal - Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Grüntal
Terminplan Grundschule Grüntal
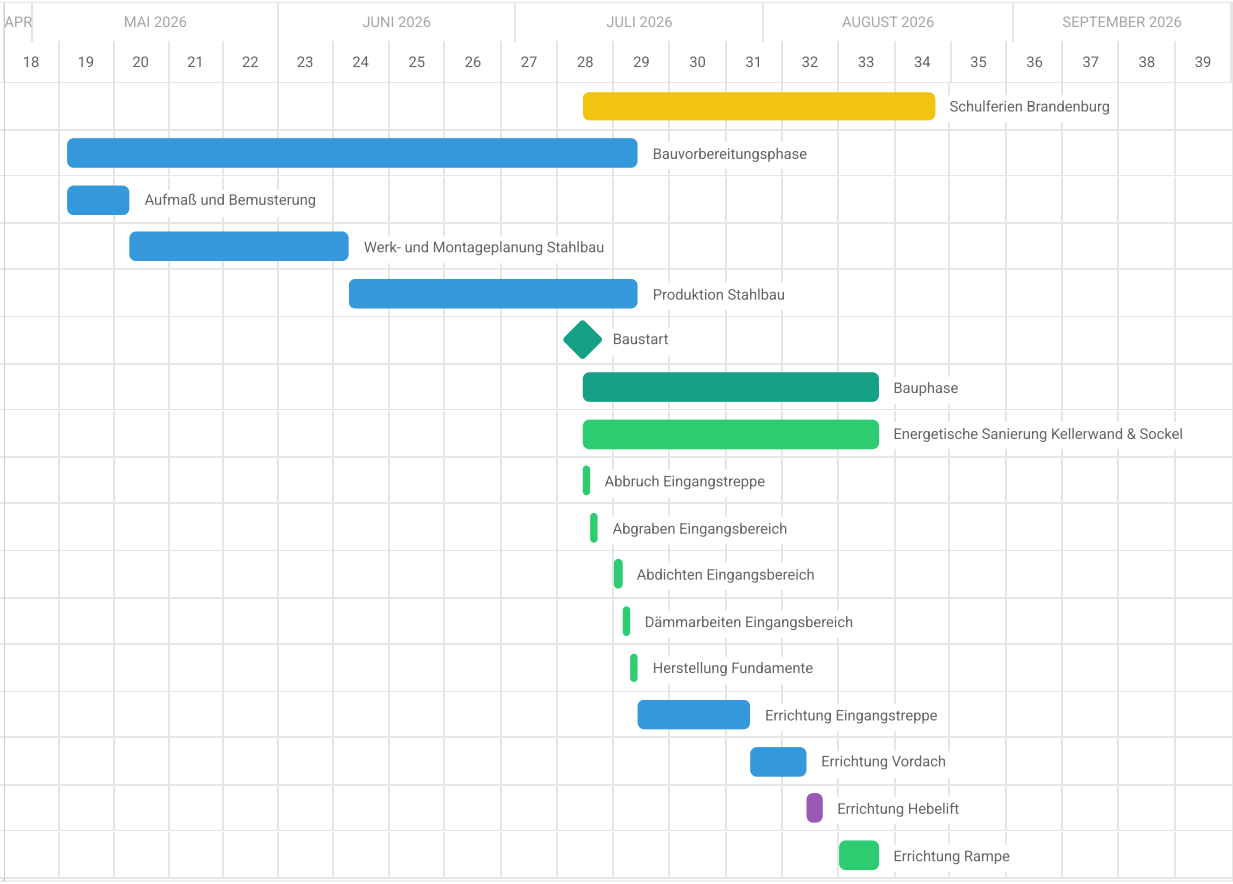
PSP	BEZEICHNUNG	BEGINN	ENDE	DAUER
1	Schulferien Brandenburg	09.07.2026	21.08.2026	32
2	**– Bauvorbereitungsphase**	**05.05.2026**	**15.07.2026**	**52**
2.1	Aufmaß und Bemusterung	05.05.2026	12.05.2026	6
2.2	Werk- und Montageplanung Stahlbau	13.05.2026	09.06.2026	20
2.3	Produktion Stahlbau	10.06.2026	15.07.2026	26
3	**Baustart**	**09.07.2026**	**09.07.2026**	**0**
4	**– Bauphase**	**09.07.2026**	**14.08.2026**	**27**
4.1	Energetische Sanierung Kellerwand & Sockel	09.07.2026	14.08.2026	27
4.2	Abbruch Eingangstreppe	09.07.2026	09.07.2026	1
4.3	Abgraben Eingangsbereich	10.07.2026	10.07.2026	1
4.4	Abdichten Eingangsbereich	13.07.2026	13.07.2026	1
4.5	Dämmarbeiten Eingangsbereich	14.07.2026	14.07.2026	1
4.6	Herstellung Fundamente	15.07.2026	15.07.2026	1
4.7	Errichtung Eingangstreppe	16.07.2026	29.07.2026	10
4.8	Errichtung Vordach	30.07.2026	05.08.2026	5
4.9	Errichtung Hebelift	06.08.2026	07.08.2026	2
4.10	Errichtung Rampe	10.08.2026	14.08.2026	5
