23-03-O_Sanierung Sportplatz Lenzen

Terminplanung Stand 22.07.2026

Planungsabläufe	Start	Ende
LP 3 Entwurfsplanung	**02.05.2024**	**29.07.2024**
Lageplan, Leitungsplan, Details	02.05.2024	29.07.2024
Objektbeschreibung, Erläuterung AEB	17.05.2024	03.06.2024
Kostenberechnung, Kostenvergleich zur Kostenschätzung	03.06.2024	29.07.2024
Abstimmung mit Fachplanern und Behörden	17.06.2024	29.07.2024
Abgabe Entwurfsplanung		29.07.2024
LP 4 Genehmigungsplanung	**01.08.2024**	**04.05.2026**
Erarbeiten der Vorlagen für Bauantrag	01.08.2024	11.09.2024
Abgabe Bauantrag		11.09.2024
Genemigungsphase Behörde	11.09.2024	13.12.2024
Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen	16.12.2024	17.01.2025
Baufachliche Prüfung Behörde	14.07.2025	13.02.2026
Überarbeitung durch Projektträger	16.02.2026	04.05.2026
LP 5 Ausführungsplanung	**15.10.2024**	**05.06.2026**
Erarbeiten der Lage- und Detailpläne, Abwicklungen, Konstruktionszeichnungen etc.	15.10.2024	21.02.2025
Abstimmung mit beteiligten Fachplanern	13.01.2025	24.01.2025
Fortschreibung der Kosten	24.01.2025	07.02.2025
Abgabe Ausführungsplanung nach mehrfachen Plananpassungen und Kostenreduzierungen		19.06.2025
Prüfung und Einarbeitung der Auflagen/Forderungen des Projektträgers	20.05.2026	05.06.2026
LP 6 Vorbereitung Vergabe (LV)	**20.10.2025**	**19.06.2026**
Aufstellen Leistungsverzeichnis einschl. Kosten	20.10.2025	19.03.2026
Abstimmung mit Fachplanern	20.10.2025	19.03.2026
Prüfung und Einarbeitung der Auflagen/Forderungen des Projektträgers	20.05.2026	05.06.2026
Übergabe LV an AG		08.06.2026
Prüfung/Überarbeitung LV	15.06.2026	18.06.2026
Abgabe Vergabeunterlagen		19.06.2026
LP 7 Veröffentlichung	**24.07.2026**	**28.08.2026**
Veröffentlichung		24.07.2026
Submission		14.08.2026
Prüfung	17.08.2026	24.08.2026
Beschluss Stadtverordnetenversammlung		28.08.2026
Beauftragung	Anfang August	
Bindefrist		14.09.2026
LP 8 Baubeginn/Bauende	**14.09.2026**	**03.12.2027**
Bauausführung	14.09.2026	27.08.2027
Fertigstellungspflege	12.04.2027	15.10.2027
Prüfung Schlussrechnung	01.11.2027	03.12.2027

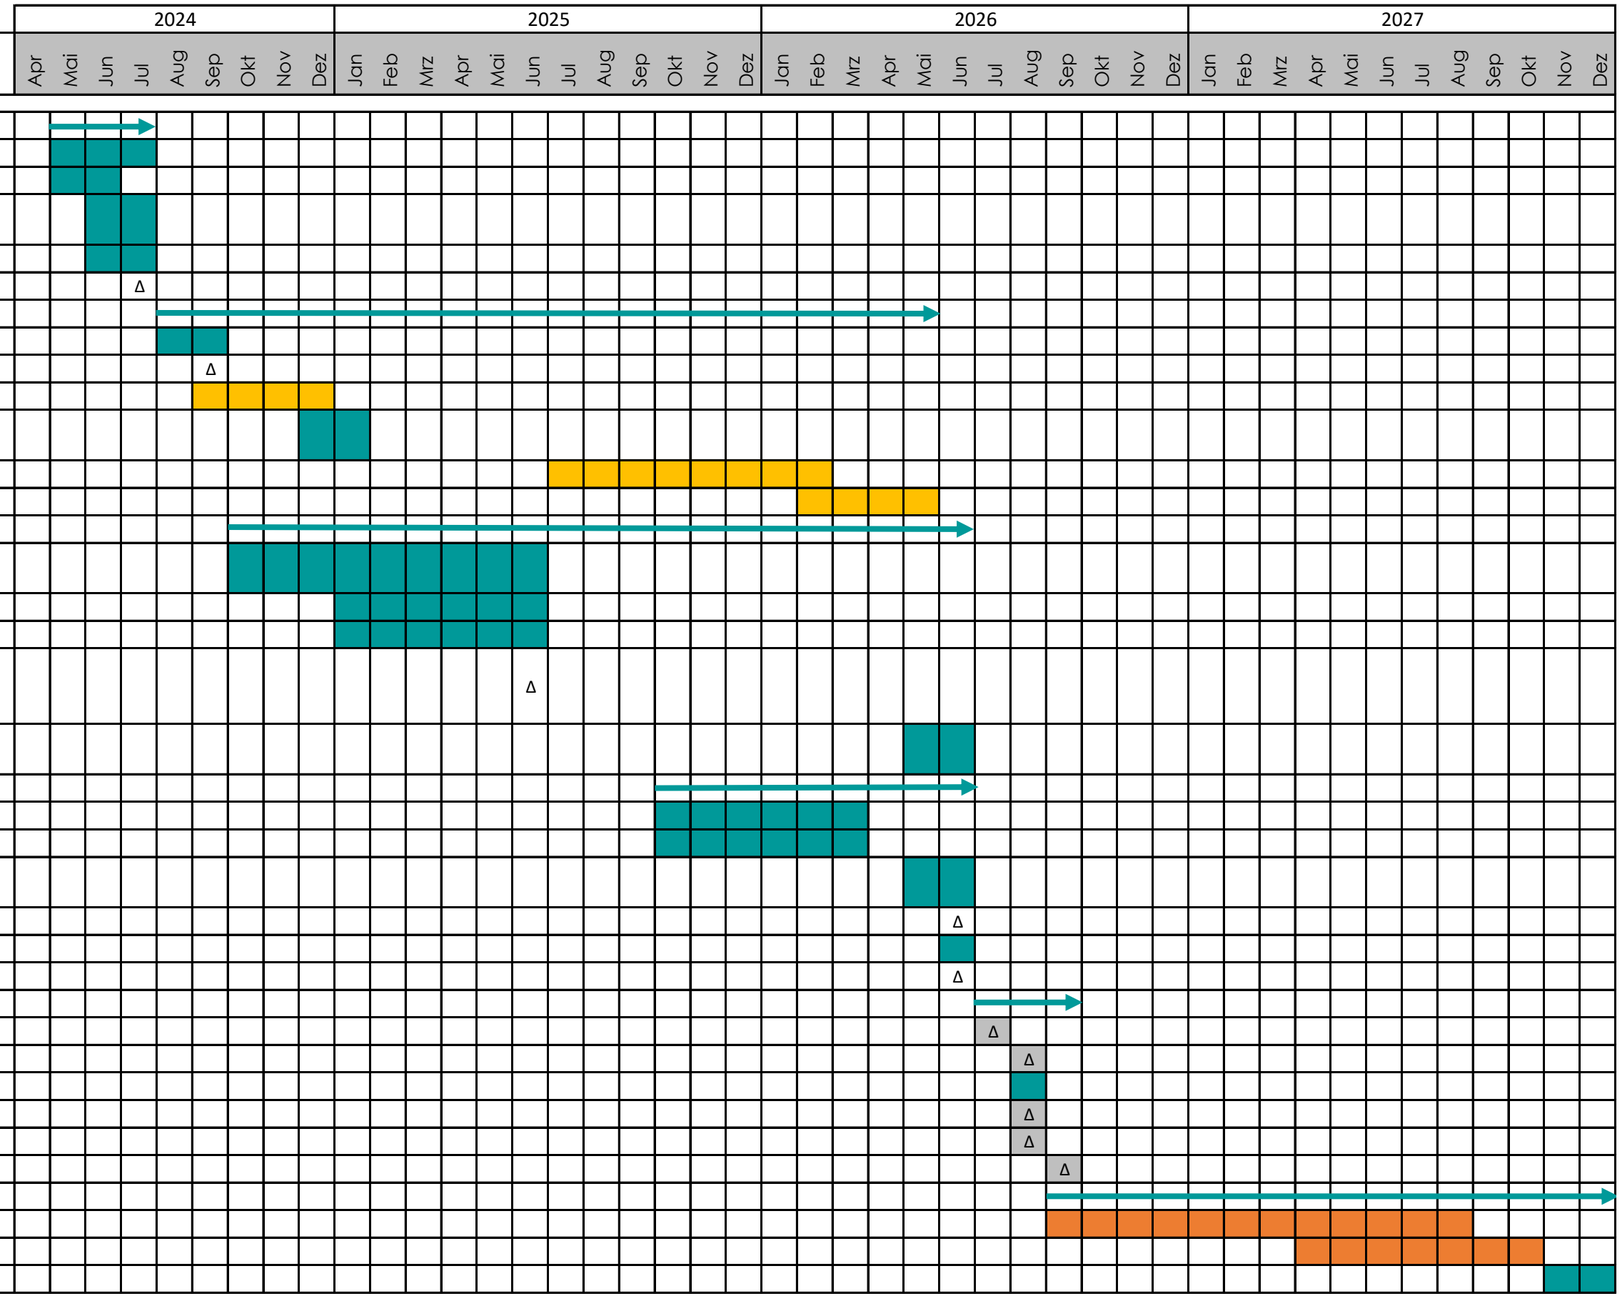

Δ Meilenstein

- ALA
- AG
- Behörden
- Fachplaner
- Baufirma
