Projektnummer: 2203 GWE Erweiterungsbau

Bauzeitenplan

Erweiterung der Grundschule Westerburg, Emden

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Ausschreibung & Vergabe	367kt	26.08.24	27.08.25
1.2	Vergabepaket 1	84kt	27.08.24	18.11.24
4	**Baustelleneinrichtung (BE)**	**449at**	**19.11.24**	**01.10.26**
5				
6	**Baustellenüberwachung (BE)**	**390at**	**25.02.25**	**25.09.26**
7				
8	**Tiefgründung & Erdarbeiten (T&E)**	**46at**	**02.12.24**	**24.02.25**
9				
10	**Bauhauptarbeiten (BHA)**	**173kt**	14.02.25	05.08.25
12	**Gerüstarbeiten**	**286at**	**30.04.25**	**03.07.26**
14	**Zimmer-/Holzbauarbeiten**	**135at**	**23.04.25**	**06.11.25**
16	**Abdichtung Sockel**	**20at**	27.08.25	23.09.25
18	**Dachabdichtung Gründach**	**106at**	**30.07.25**	**09.01.26**
22	**Metallbau Fenster & Türen**	**30at**	**27.08.25**	**08.10.25**
32	**Elektroarbeiten**	**271at**	**16.05.25**	**26.06.26**
38	**Heizungsarbeiten**	**141at**	**30.07.25**	**27.02.26**
40	**Sanitärarbeiten**	**267at**	**21.03.25**	**28.04.26**
42	**Lüftungsarbeiten**	**85at**	**26.01.26**	**29.05.26**
52	**Aufzugsanlagen**	**348at**	**22.04.25**	**21.09.26**

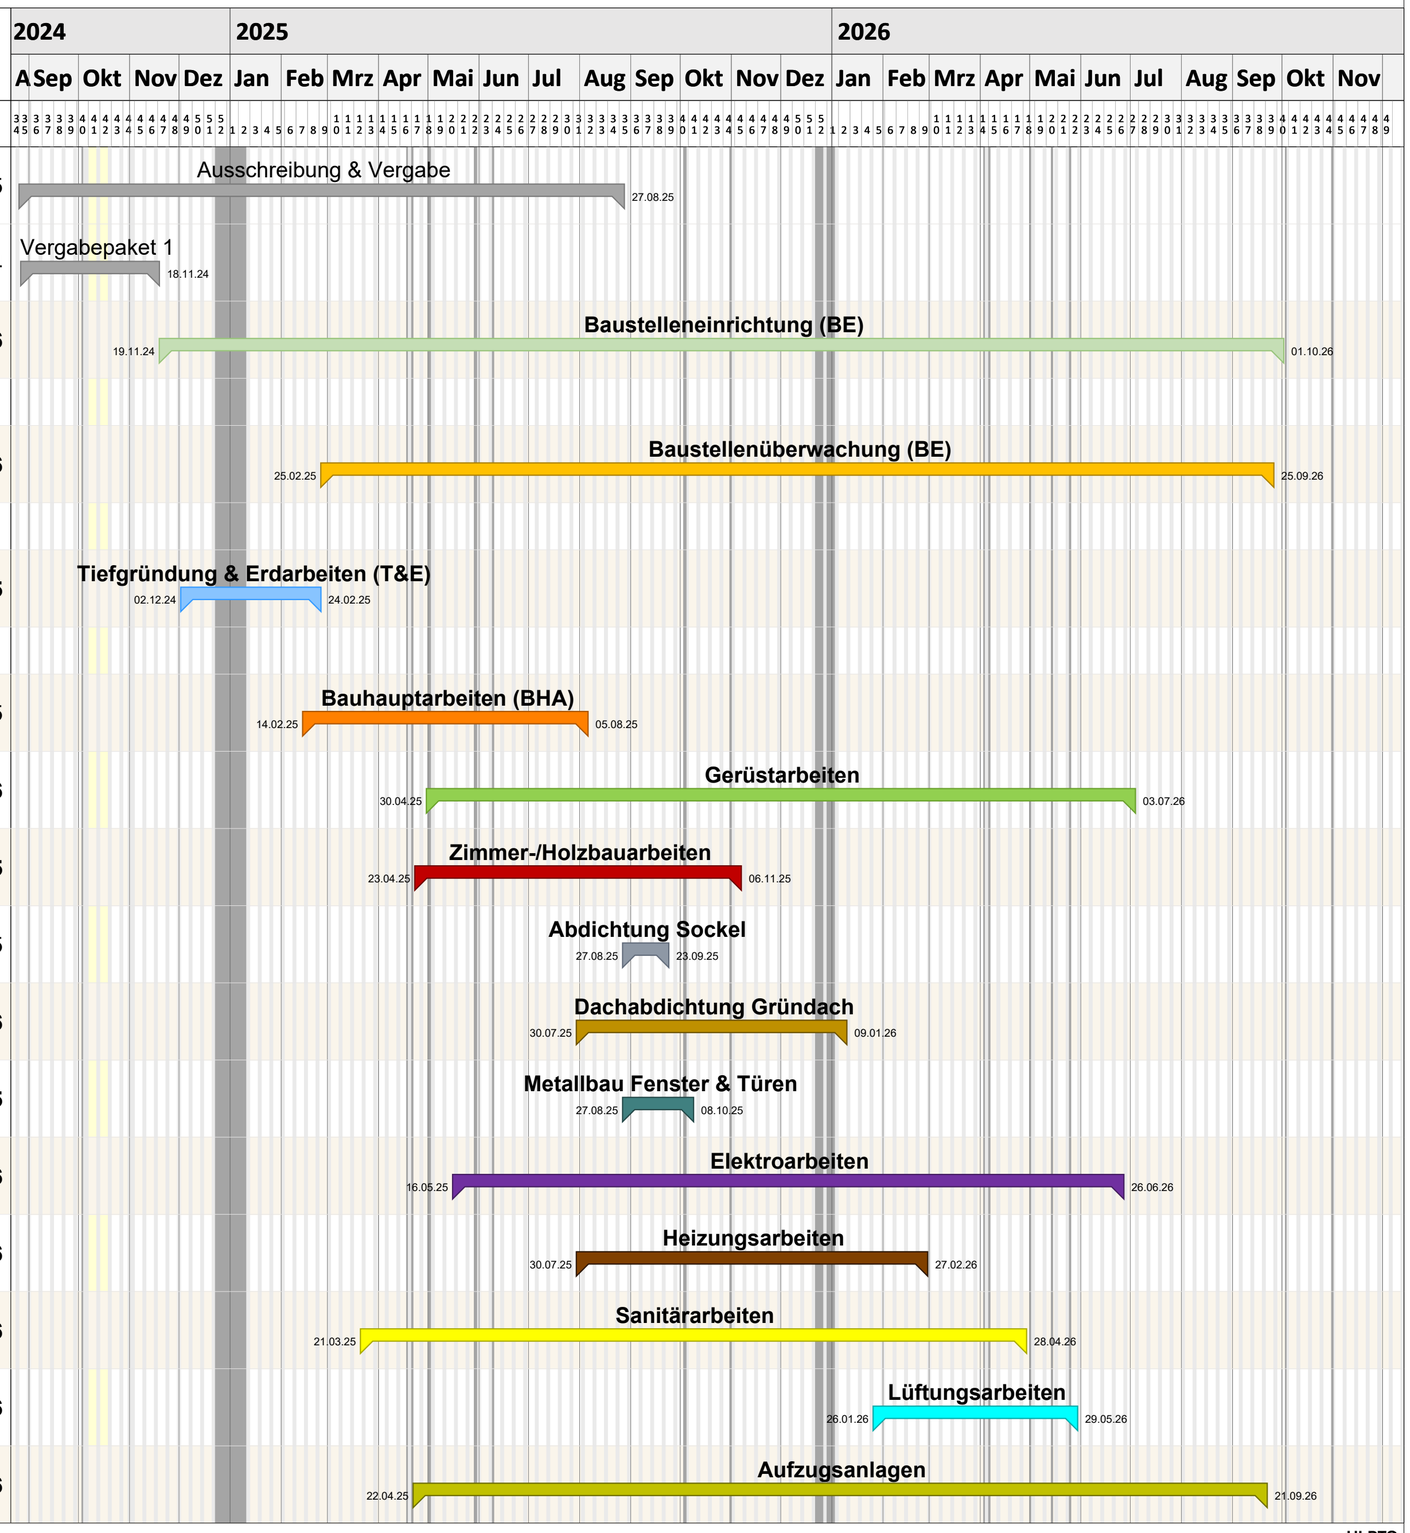

Druckdatum: 12.08.2024 12:17
Kalender: Niedersachsen (eingebettet)

ULPTS ARCHI +EKTEN
