2073.0
Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez (#80051)

BAUZEITENPLAN 1.BA

STAND: 11.05.2026
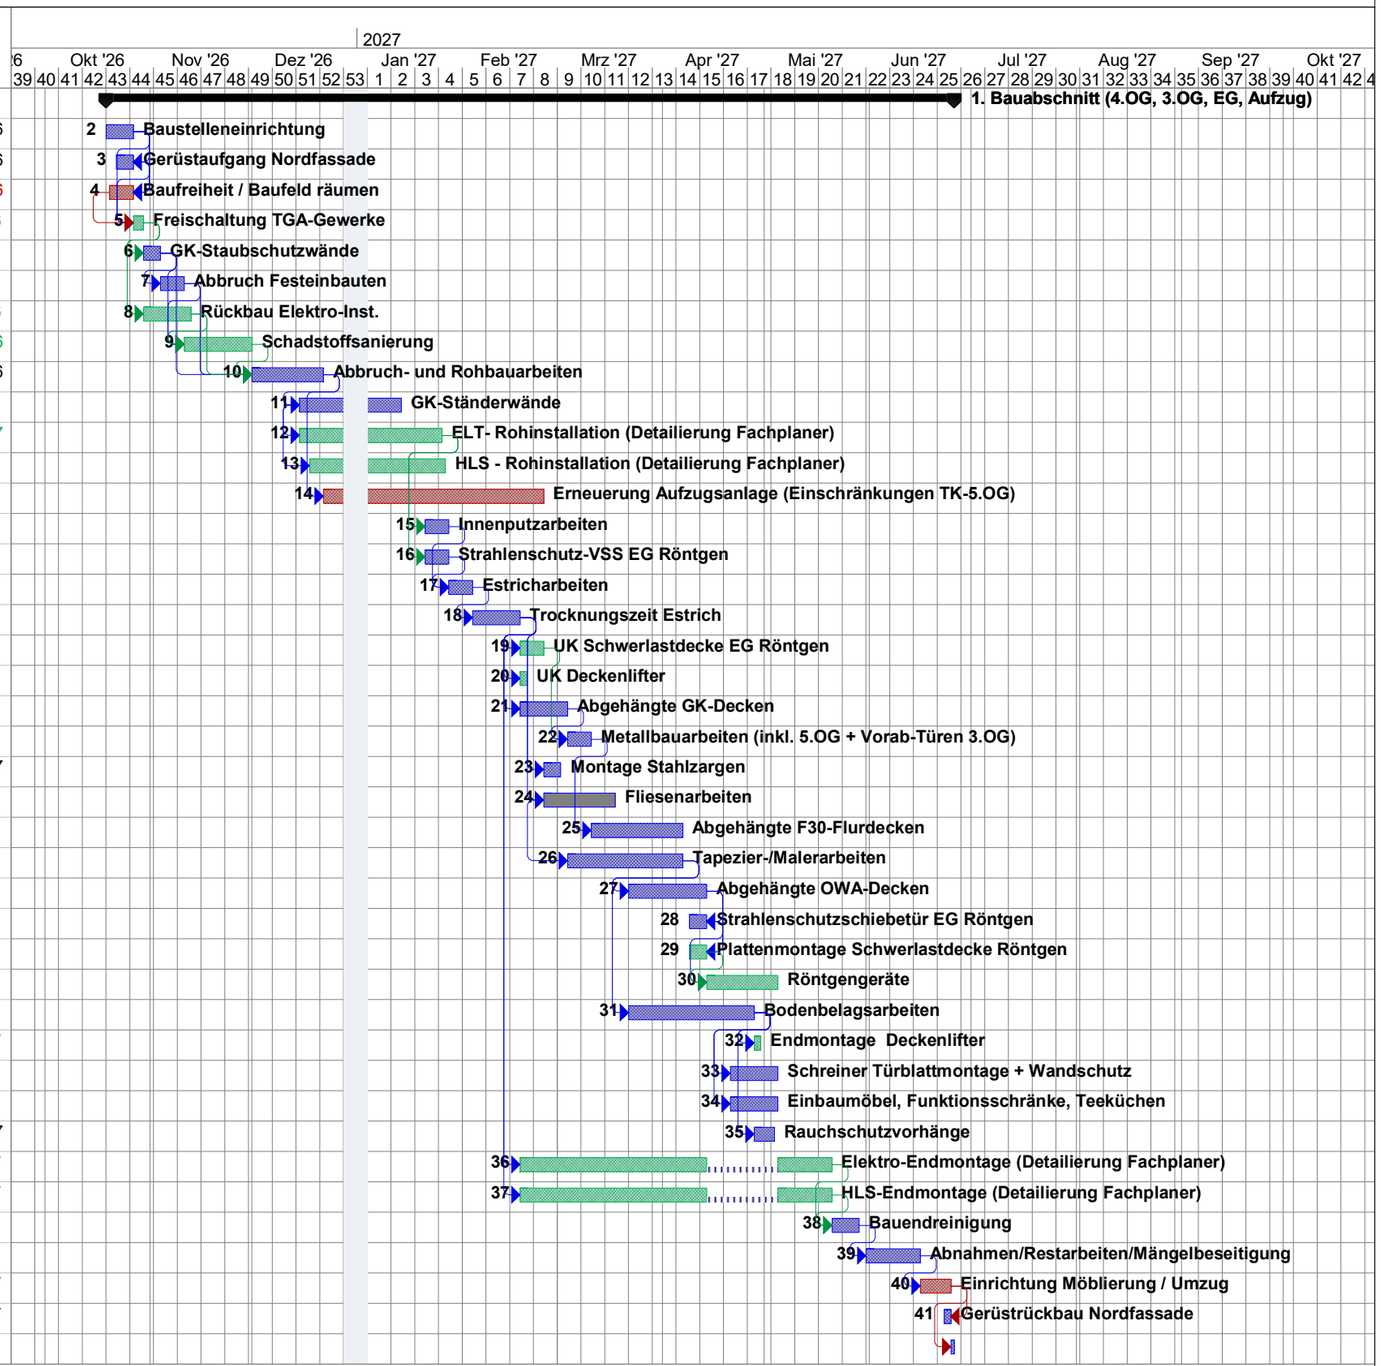
Nr.	Vorgangsname	Firma	Dauer	Anfang	Ende
1	**1. Bauabschnitt (4.OG, 3.OG, EG, Aufzug)**		**167 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 25.06.27**
2	Baustelleneinrichtung		6 Tage	Mon 19.10.26	Mon 26.10.26
3	Gerüstaufgang Nordfassade		3 Tage	Don 22.10.26	Mon 26.10.26
4	Baufreiheit / Baufeld räumen	Bauherr	5 Tage	Die 20.10.26	Mon 26.10.26
5	Freischaltung TGA-Gewerke		3 Tage	Die 27.10.26	Don 29.10.26
6	GK-Staubschutzwände		3 Tage	Fre 30.10.26	Die 03.11.26
7	Abbruch Festeinbauten		5 Tage	Mit 04.11.26	Die 10.11.26
8	Rückbau Elektro-Inst.		10 Tage	Fre 30.10.26	Don 12.11.26
9	Schadstoffsanierung		14 Tage	Mit 11.11.26	Mon 30.11.26
10	Abbruch- und Rohbauarbeiten		15 Tage	Die 01.12.26	Mon 21.12.26
11	GK-Ständerwände		14 Tage	Die 15.12.26	Mit 13.01.27
12	ELT- Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)		22 Tage	Die 15.12.26	Mon 25.01.27
13	HLS - Rohinstallation (Detailierung Fachplaner)		20 Tage	Fre 18.12.26	Die 26.01.27
14	Erneuerung Aufzugsanlage (Einschränkungen TK-5.OG)		39 Tage	Die 22.12.26	Mit 24.02.27
15	Innenputzarbeiten		5 Tage	Don 21.01.27	Mit 27.01.27
16	Strahlenschutz-VSS EG Röntgen		5 Tage	Don 21.01.27	Mit 27.01.27
17	Estricharbeiten		5 Tage	Don 28.01.27	Mit 03.02.27
18	Trocknungszeit Estrich		10 Tage	Don 04.02.27	Mit 17.02.27
19	UK Schwerlastdecke EG Röntgen		5 Tage	Don 18.02.27	Mit 24.02.27
20	UK Deckenlifter		2 Tage	Don 18.02.27	Fre 19.02.27
21	Abgehängte GK-Decken		10 Tage	Don 18.02.27	Mit 03.03.27
22	Metallbauarbeiten (inkl. 5.OG + Vorab-Türen 3.OG)		5 Tage	Don 04.03.27	Mit 10.03.27
23	Montage Stahlzargen		3 Tage	Don 25.02.27	Mon 01.03.27
24	Fliesenarbeiten		15 Tage	Don 25.02.27	Mit 17.03.27
25	Abgehängte F30-Flurdecken		17 Tage	Don 11.03.27	Die 06.04.27
26	Tapezier-/Malerarbeiten		22 Tage	Don 04.03.27	Die 06.04.27
27	Abgehängte OWA-Decken		15 Tage	Mon 22.03.27	Die 13.04.27
28	Strahlenschutzschiebetür EG Röntgen		3 Tage	Fre 09.04.27	Die 13.04.27
29	Plattenmontage Schwerlastdecke Röntgen		3 Tage	Fre 09.04.27	Die 13.04.27
30	Röntgengeräte		15 Tage	Mit 14.04.27	Die 04.05.27
31	Bodenbelagsarbeiten		25 Tage	Mon 22.03.27	Die 27.04.27
32	Endmontage Deckenlifter		2 Tage	Mit 28.04.27	Don 29.04.27
33	Schreiner Türblattmontage + Wandschutz		10 Tage	Mit 21.04.27	Die 04.05.27
34	Einbaumöbel, Funktionsschränke, Teeküchen		10 Tage	Mit 21.04.27	Die 04.05.27
35	Rauchschutzvorhänge		4 Tage	Mit 28.04.27	Mon 03.05.27
36	Elektro-Endmontage (Detailierung Fachplaner)		47 Tage	Don 18.02.27	Don 20.05.27
37	HLS-Endmontage (Detailierung Fachplaner)		47 Tage	Don 18.02.27	Don 20.05.27
38	Bauendreinigung		5 Tage	Fre 21.05.27	Fre 28.05.27
39	Abnahmen/Restarbeiten/Mängelbeseitigung		12 Tage	Mon 31.05.27	Die 15.06.27
40	Einrichtung Möblierung / Umzug	Bauherr	7 Tage	Mit 16.06.27	Don 24.06.27
41	Gerüstrückbau Nordfassade		2 Tage	Mit 23.06.27	Don 24.06.27
42	Inbetriebnahme		1 Tag	Fre 25.06.27	Fre 25.06.27
