Projektnummer: 2109

Bauzeitenplan

Schifferstadt - WDH

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Baustelleneinrichtung	10at	Mo, 17.08.2	Fr, 28.08.26
2	Schutzmaßnahmen Ringer	68kt	Mo, 31.08.2	Fr, 06.11.26
2.1	Ringerhalle 2	26tt	Mo, 31.08.2	Fr, 25.09.26
2.2	Ringerhalle 1	33tt	Mo, 05.10.2	Fr, 06.11.26
3	Vorbereitung Technikzentrale	15at	Mo, 05.10.2	Fr, 23.10.26
4	Rückbauarbeiten	98at	Di, 03.11.26	Mo, 22.03.2
5	Rohbauarbeiten	37at	Di, 06.04.27	Mo, 31.05.2
6	Dachdämmung	27at	Mo, 19.04.2	Fr, 28.05.27
7	Putz	15at	Mo, 13.09.2	Fr, 01.10.27
8	Trockenbau	99at	Di, 02.11.27	Fr, 17.03.28
9	Estrich	10at	Mo, 11.10.2	Fr, 22.10.27
10	Verglasung	89tt	Mo, 31.05.2	Fr, 27.08.27
11	WDVS	64at	Mo, 16.08.2	Fr, 12.11.27
12	Fliesen	55at	Mo, 15.11.2	Fr, 28.01.28
13	Bodenbelag	20at	Mo, 13.03.2	Fr, 07.04.28
14	Maler	133tt	Di, 02.11.27	Mo, 13.03.2
15	Türen	9at	Mo, 24.04.2	Fr, 05.05.28
16	Hallentragwerk Mero	20at	Mo, 31.05.2	Fr, 25.06.27
17	Prallwand	45at	Mo, 30.08.2	Fr, 29.10.27
18	Sportboden	35at	Mo, 10.01.2	Fr, 25.02.28
19	Trennvorhang	20at	Mo, 13.03.2	Fr, 07.04.28
20	Sportgeräte	264tt	Mo, 16.08.2	Fr, 05.05.28
21	Außenanlage	194tt	Mo, 31.05.2	Fr, 10.12.27
22	Reinigung	10at	Mo, 08.05.2	Fr, 19.05.28
23	Inbetriebnahmen	18at	Mo, 29.05.2	Fr, 23.06.28
24	Elektro	677kt	Mo, 17.08.2	Fr, 23.06.28
25	Heizung	656kt	Mo, 07.09.2	Fr, 23.06.28
26	Sanitär	456at	Mo, 07.09.2	Fr, 23.06.28
27	Lüftung	431at	Mo, 12.10.2	Fr, 23.06.28
28	Dämmung HLS	20at	Mo, 30.08.2	Fr, 24.09.27

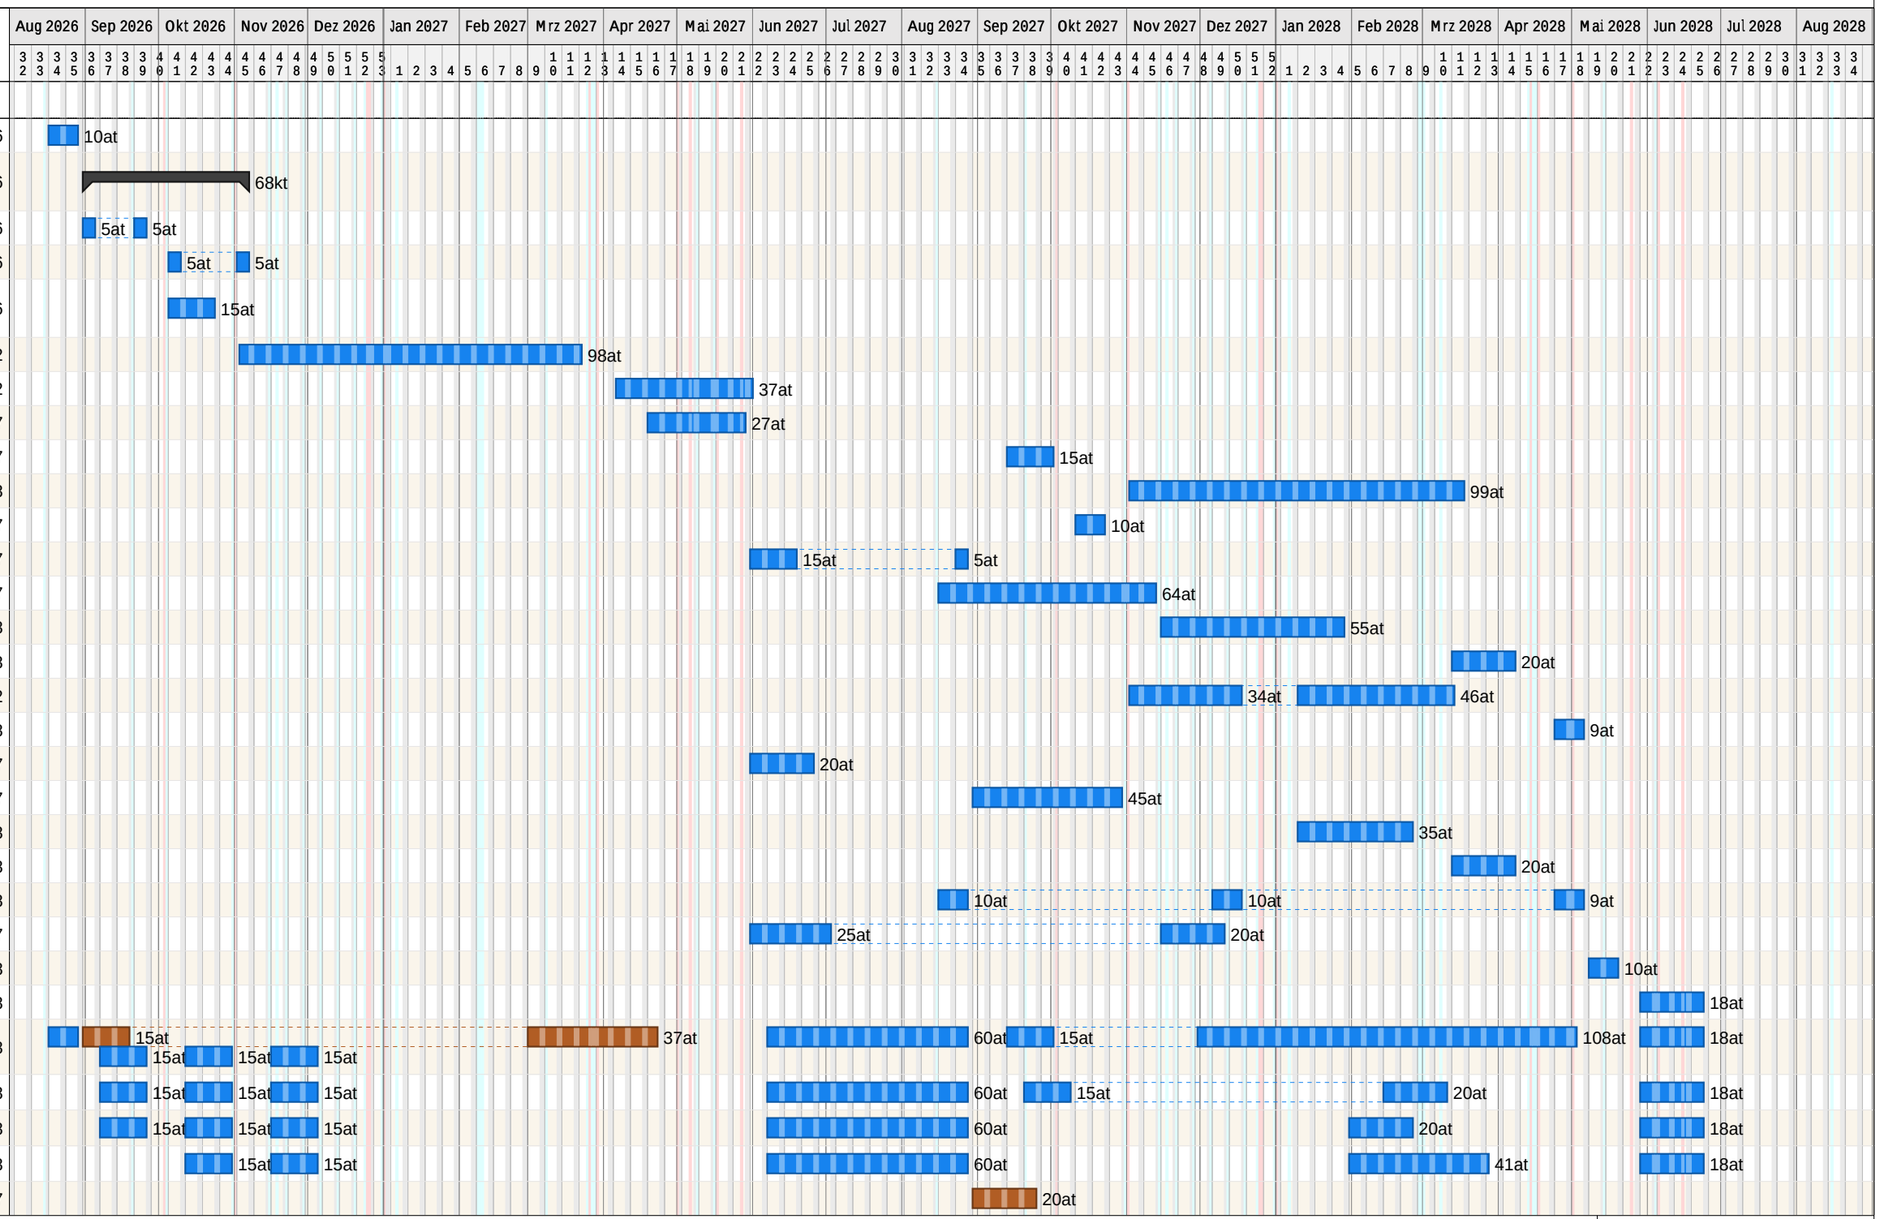

erstellt mit pro Plan 7 (7.0.0.25) Serien Nr.: 163 Lizenz für DIEHL Architekten, Hochdorf-Assenheim

Projektzeitrahmen von Sa, 01.08.26 bis Do, 31.08.28
Kalender: Rheinland-Pfalz (eingebettet)
Druckdatum: 28.05.2026 14:10
Filter:
Bearbeiter: chdiehl

DIEHL Architekten
Keltenstr. 16
D-67126 Hochdorf-Assenheim
Tel. +49 6231 91920
Fax +49 6231 919211
e-Mail: mail@diehl-architekten.de
