Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**ESN- Neustadt -MÜSE**			
2	Vergabe	0 Tage	Don 01.10.26	Don 01.10.26
3	Bauanlaufbesprechung	0 Tage	Don 15.10.26	Don 15.10.26
4	Vertragsfrist - Projektierung - Abbruch	0 Tage	Die 15.12.26	Die 15.12.26
5	Vertragsfrist - Projektierung - Gesamt	0 Tage	Fre 29.01.27	Fre 29.01.27
6	AN -Projektierungsphase	77 Tage	Don 15.10.26	Fre 29.01.27
7	**Lieferzeiten**	**90 Tage**	**Die 01.12.26**	**Mon 05.04.27**
8	Lieferzeit - Zentrifuge - Abfrage im LV	90 Tage	Die 01.12.26	Mon 05.04.27
9	Lieferzeit pFMA	80 Tage	Mon 14.12.26	Fre 02.04.27
10	**Demontage-Neubau-Sanierung**	**79 Tage**	**Mon 21.12.26**	**Don 08.04.27**
11	Demontage Maschinen/Anlagen	21 Tage	Mon 21.12.26	Mon 18.01.27
12	Demontage Elektro	17 Tage	Mon 11.01.27	Die 02.02.27
13	Abbrucharbeiten	9 Tage	Mon 08.02.27	Don 18.02.27
14	Bauarbeiten	21 Tage	Mon 22.02.27	Mon 22.03.27
15	Sonstige Sanierungsarbeiten	14 Tage	Mon 22.03.27	Don 08.04.27
16	**Neuanlagen**	**45 Tage**	**Mon 05.04.27**	**Mon 07.06.27**
17	Montage Zentrifugen	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27
18	Montage pFMA	10 Tage	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27
19	Montage Peripherie	14 Tage	Mon 03.05.27	Don 20.05.27
20	Montage Elektrotechnik	21 Tage	Don 06.05.27	Don 03.06.27
21	Vertragsfrist - Beginn Inbetriebnahme	0 Tage	Mon 07.06.27	Mon 07.06.27
22	**Inbetriebnahmephasen**	**45 Tage**	**Mon 07.06.27**	**Fre 06.08.27**
23	Kalt-/Warmfahrten	14 Tage	Mon 07.06.27	Don 24.06.27
24	Optimierungsphase	8 Tage	Don 24.06.27	Mon 05.07.27
25	Probebetrieb	10 Tage	Mon 05.07.27	Fre 16.07.27
26	Garantiefahrten	5 Tage	Mon 19.07.27	Fre 23.07.27
27	Auswertung Leistungsnachweis	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27
28	**Abnahme**	0 Tage	Die 31.08.27	Die 31.08.27

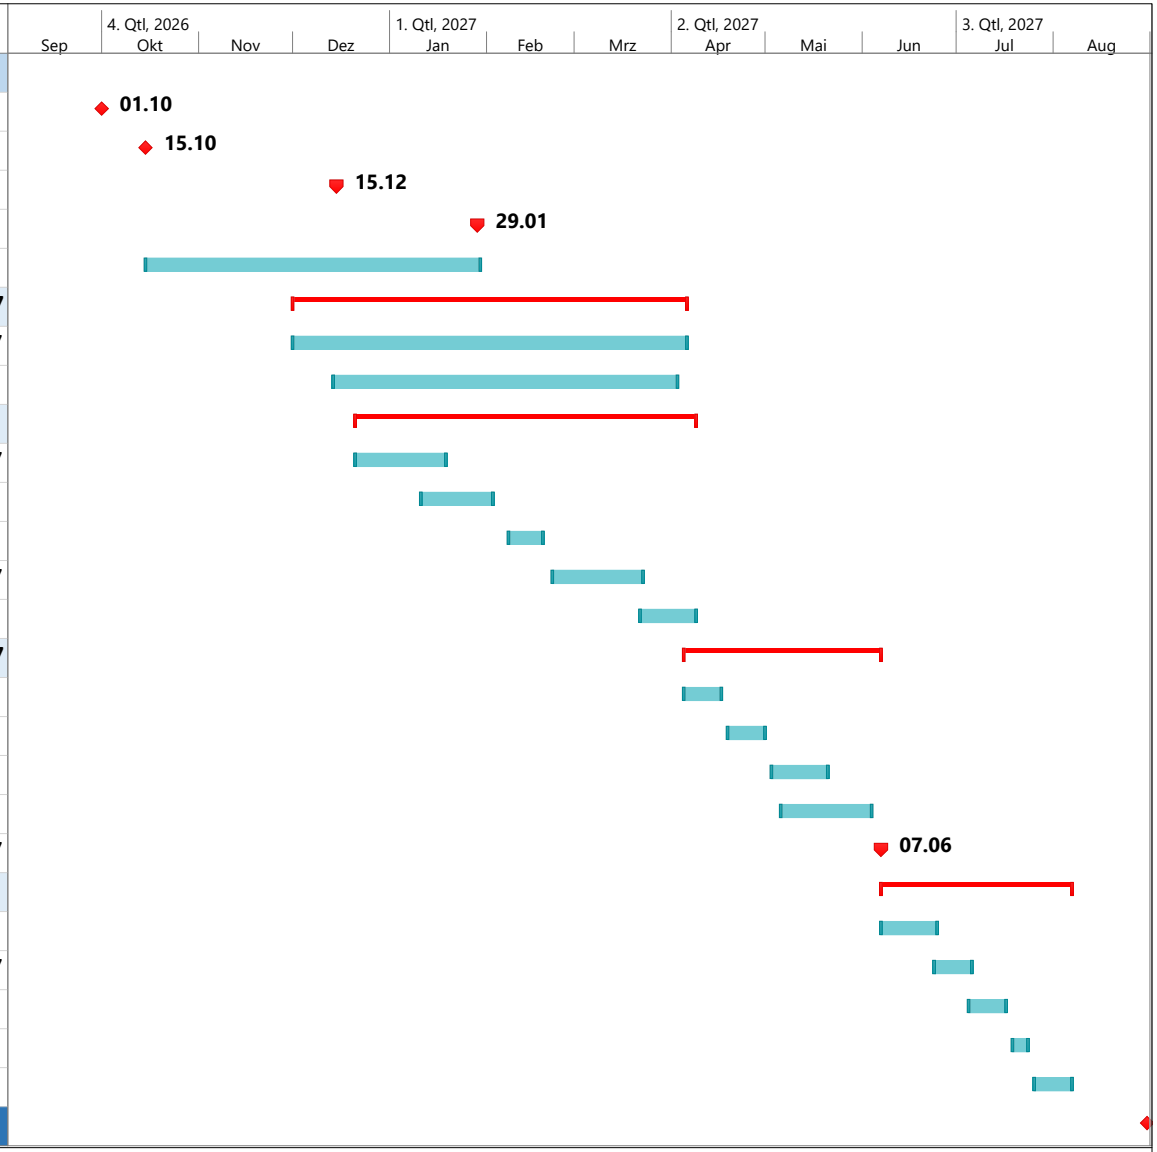

Projekt: KA Neustadt a.d. Wein
Datum: Mon 18.05.26

Vorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Anfang		Kritische Unterbrechung	
Unterbrechung		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Manueller Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Nur Dauer		Externer Meilenstein			
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Stichtag			
Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Kritisch			
