

Musterdokument AIA

Auftraggeber-Informationsanforderungen für
BIM-Projekte der DB InfraGO AG, Geschäftsbe-
reich Fahrweg

DB InfraGO AG
Geschäftsbereich Fahrweg

I.NIG 12

Musterdokument
Auftraggeber-Informationsanforderungen

Version 5.1

Version	Änderung durch	Beschreibung	Datum
1.0	I.NGXBIM - Teichgräber	Finaler Entwurf zur Abstimmung	13.09.2018
1.1	I.NGXBIM - Teilprojekt 2	Überarbeitung mit Input aus BAC und nach Abstimmung mit I.NP	22.05.2019
2.0	I.NGXBIM - Teilprojekt 2	Überarbeitung nach Abstimmung mit HLI, Erstveröffentlichung im Prozessportal	31.05.2019
3.0	I.NGM 1(B)	Überarbeitung mit Input aus BAC Recall und TP3 und TP4	09.06.2020
4.0	I.NIG 13 - TP2	Überarbeitung mit Input aus BIM-Musterprojekt; Redaktionelle Änderungen	15.03.2021
5.0	I.NIG 13 - TP2	Überarbeitung mit Input von SP zur mdQS; Integration Anlage 20; Input BAC, Redaktionelle Änderungen	10.12.2021
5.1	I.NIG 12 - TP2	Integration Fachmodell Umwelt und Baugrund; Überarbeitung Dateinamenskonvention, Einbindung SOM 2.1, Integration BIM-Ziele der DB Netz AG, Redaktionelle Änderungen	17.02.2023

Ergänzungen, Änderungsvorschläge sowie Anmerkungen bitte per Mail an:

Name	OE	E-MAIL
Christoph Palm	I.NIG 12 - Grundsätze und Entwicklung BIM	Christoph.Palm@deutschebahn.com

Bearbeitungshinweis:

Das vorliegende Musterdokument ist eine Bearbeitungshilfe zur Erstellung der AIA und ist projektspezifisch im Rahmen der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen anzupassen.

Formatierung	Beschreibung
<Text>	Platzhalter - Inhalte sind entsprechend zu ergänzen.
Kommentar	Bearbeitungshinweis. Diese sind nach Abschluss der Bearbeitung zu löschen

Diesen Bearbeitungshinweis und Kommentare nach Abschluss der Bearbeitung löschen!

Kommentiert [A1]: Ausfüllhinweis:
Diesen Bearbeitungshinweis bitte im finalen Dokument löschen

Kopf- und Fußzeile bitte im finalen Dokument projektspezifisch anpassen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4
1.1 Ziel der Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)	4
1.2 Allgemeine Angaben zum Projekt	4
1.3 BIM-Ziele des Projekts	5
1.4 BIM-Anwendungsfälle (AWF) der DB Netz AG	8
2 Organisation im Projekt	9
2.1 Besprechungswesen	9
2.2 Rollen und Verantwortlichkeiten	10
3 Prozesse	12
3.1 Daten- und Informationsmanagement	12
3.2 modellgestützte Qualitätssicherung	13
3.3 Fachmodell erstellen	14
3.4 Koordinationsmodell erstellen	14
3.5 Kollisionsprüfung durchführen	14
3.6 Virtual Design Review (VDR)	14
3.7 Freigabe durch den AG	15
4 Softwareeinsatz	16
4.1 BIM-CAD-Software	16
4.2 Einsatz einer CDE / Projektkommunikationsplattform	16
4.3 Datenaustauschformate	23
4.4 Nomenklatur	24
5 Anforderungen an Struktur, Daten und Modelle	26
5.1 Anforderungen an Modelle	26
5.2 Modellstruktur und Attribuierung	35
6 Datenübergabe und lieferbare Leistungen	36
6.1 Datenübergabe durch den AG zu Leistungsbeginn	36
6.2 Lieferbare Leistungen durch den AN	36
Anlagen	37

1 Einleitung

1.1 Ziel der Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)

Bei der Durchführung von Projekten nach der BIM-Methodik werden stärker als in der bisherigen Projektabwicklung digitale Daten in bearbeitbarer Form gemeinsam genutzt.

Die AIA werden ergänzend zu den Leistungsbeschreibungen und dem Ingenieurvertrag Vertragsbestandteil bei BIM-Projekten der DB Netz AG.

Die AIA ist ein Dokument, in dem der Auftraggeber die für ihn relevanten Ziele und Anwendungen und vom Auftragnehmer geforderten Leistungen und Daten beschreibt. **Leistungsbeschreibungen** beinhalten hauptsächlich technisch **was** im Projekt zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang gefordert wird. Die **AIA** beschreiben, **wie** Leistungen hinsichtlich Datenformate und Methodik zu erbringen sind. Sie sind eine Spezifikation von Daten und Informationsbedarf eines Bestellers an seine Lieferanten im Zuge einer Angebotsanfrage oder Vergabe.

Der Fokus liegt hierbei darauf einen möglichst konfliktfreien, digitalen Informationsfluss zwischen Projektbeteiligten in BIM-Projekten zu regeln. Dies geschieht zum einen durch die Festlegung standardisierter Prozessabläufe und zum anderen durch die Festlegung von neutralen, marktüblichen Schnittstellenformaten zur Übergabe von Informationen als Daten.

Zusammenspiel mit dem BIM-Projektabwicklungsplan (BAP).

Im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) beschreibt der AN, wie er die Anforderungen aus den AIA im Projekt umsetzt. Der BAP dokumentiert die Festlegungen zur gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen allen Projektbeteiligten. Der BAP wird erstmalig durch den AN im Rahmen der Angebotsbearbeitung erstellt. Als Vorlage liegt den Ausschreibungsunterlagen ein Musterdokument bei. Der BAP ist ein Wertungskriterium für die Zuschlagserteilung. Weitere Informationen hierzu enthalten die Ausschreibungsunterlagen. Im weiteren Projektverlauf ist der BAP ein „lebendes“ Dokument, welches kontinuierlich während der Projektlaufzeit fortgeschrieben wird. Der BAP wird daher nicht als Vertragsbestandteil vereinbart.

1.2 Allgemeine Angaben zum Projekt

Projekt: <Projektbezeichnung>

Projektnummer: <Projektnummer>

Auftraggeber: <OE-Name>

<Adresse>

...

...

Projektleiter: <Name / OE / Tel. / Email>

Projektbeschreibung: <Kurzbeschreibung>

Kommentiert [A2]: Ausfüllhinweis:

Bitte die Arbeitsanweisung „BIM Anwendung managen“ berücksichtigen - abgelegt im Regelwerksportal Symbio

Bei Verbundprojekten mit DB S&S ist der Leitfaden „BIM-GBV-Projekte“ im Regelwerksportal Symbio zu beachten

Kommentiert [A3]: Ausfüllhinweis:

Hier kann ein Verweis auf ein separates Dokument mit Projektbeschreibung erfolgen.

1.3 BIM-Ziele des Projekts

Die BIM-Implementierung ist ein unverzichtbarer Baustein der Digitalisierungsstrategie der DB. BIM liefert einen wesentlichen Beitrag, um die aktuellen und künftigen Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur zu bewältigen. Gemäß der vom Vorstandsressort Infrastruktur veröffentlichten Strategie wird mit BIM das übergeordnete Ziel verfolgt

„Infrastruktur besser planen, bauen und betreiben – bessere Infrastruktur planen, bauen und betreiben!“

Durch die Umsetzung der Strategie und flächendeckende Implementierung von BIM ergeben sich die nachfolgenden Vorteile:

Hieraus abgeleitet werden im Projekt <Text> die nachfolgenden konkreten BIM-Ziele verfolgt:

Kommentiert [A4]: Ausfüllhinweis:
Mögliche BIM-Ziele nachfolgend auswählen und die restliche Zeilen mit BIM-Zielen entfernen.

1.3.1 Allgemeine BIM-Ziele

<x>	Im Projekt ist ein offenes BIM-Konzept (open BIM) umzusetzen.
<x>	Die in der Planung verwendeten Objekte und Bauteilfamilien werden ggf. strukturiert gespeichert und ggf. zum Aufbau einer standardisierten Bauteilbibliothek bei der DB Netz AG genutzt.
<x>	Die Planungsmodelle sollen in der Ausführungsphase die Grundlage für die Anwendung eines modellbasierten Projektsteuerungssystems bilden. (Zurzeit iTWO 5D, aktuell nicht anwendbar)
<x>	Planungsvarianten und Bauzustände werden mit einer Darstellung von Termin- und Kostenauswirkungen visualisiert.
<x>	Die Akzeptanz von Bauvorhaben wird durch die Visualisierung von Ausführungsplanungen gesteigert.
<x>	Die Erhebung und Weiterverarbeitung von anlagenspezifischen Daten entlang des Lebenszyklus erfolgt digital und modellbasiert.
<x>	Im BIM-Projekt werden folgende Kernelemente angewendet: ▪ Bauwerksdatenmodell (3D) ▪ AIA (Auftraggeber-Informations-Anforderungen) ▪ BAP (BIM-Projekt-Abwicklungsplan) ▪ CDE (Common Data Environment - Arbeits- und Informationsplattform) ▪ Modellunterstützte Besprechungen (VDR)

1.3.2 Bestandsmodellierung (insbesondere AwF 010, 020)

<x>	Grundlage für die Modellierung in der Planungsphase ist ein digitales Gesamtmodell für den Bestand (Vermessungsdaten, GIS-Informationen, Bestandsanlagen und Leitungen, etc.).
<x>	Das Gesamtmodell Bestand verfügt über offene Schnittstellen, um Bestandsdaten aktualisieren und nachpflegen zu können.
<x>	Reduzierung von Risiken durch Referenzieren des Projektkontextes in der Planungsphase und Erkennen von Schnittstellen zwischen Bestand und Planung
<x>	Detaillierte, flächendeckende Aufmaße der Oberfläche von großen und weitläufigen Gebieten, bestehender Gebäude, Bauwerken und Vegetation kann durch Photogrammetrie und Laserscanning ermöglicht werden.
<x>	3D-Punktwolken sollen in moderne BIM-Planungssoftware integriert werden und bilden somit die Grundlage für die objektorientierte 3D-Bestandsmodellierung (nur Photogrammetrie und Laserscanning)
<x>	Bestandsdatenmanagement mit intuitiver und schneller Verwendbarkeit aller verfügbaren Informationen (visuelle Unterstützung und Lokalisierung der Projektinformationen durch Viewer oder über die Funktionalität der CDE)
<x>	Integration und Aufnahme der Daten in Bestandsdatenbanken für DB-Projekte

1.3.3 Bauwerksdatenmodell (insbesondere AwF 030)

<x>	Erstellung von Bauwerksdatenmodellen, bestehend aus geometrischen Objekten, die über Merkmale mit semantischen Informationen angereichert werden.
<x>	Die Struktur der Fachmodelle ist mit der Kosten- und Terminplanstruktur in der jeweiligen Lph abzustimmen, um möglichst 1:1-Verknüpfungen zwischen Objekten und Informationen aus Termin- und Kostenplan herstellen zu können.
<x>	Zur Effizienzsteigerung in der Planung erfolgt die Erstellung der Fachmodelle möglichst parametrisch und Bauteilfamilien werden verwendet.
<x>	Ab Lph 3 sind für die Darstellung der Bauphasen und Baubetriebszustände auch temporäre Bauteile zu modellieren.
<x>	Als Grundlage für die Logistikplanung sind Baustelleneinrichtungsflächen, Zuwegungen sowie Lager- und sonstige Logistikflächen zu modellieren.
<x>	Zum Ende der Planungsphase verfügen die Planungsmodelle über Attributlisten, in denen Daten während der Bauphase zu integrieren sind.

1.3.4 Trassen- und Variantenvergleich (insbesondere AwF 040)

<x>	In der Lph 2 erfolgt der Trassen- und Variantenvergleich mit Hilfe von spezialisierter Software in 3D.
<x>	Für die Planungsvarianten erfolgt eine automatisierte Auswertung nach vordefinierten Kriterien (Flächenverbrauch, Betroffenheit, Erdaufrag/-abtrag, Kosten, etc.).
<x>	Planungsvarianten sind jeweils in gleicher Struktur und Detaillierungsgrad zu modellieren, um eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Varianten herstellen zu können.
<x>	Bündelung aller relevanten Randbedingungen in den Koordinations- bzw. Gesamtmodell der jeweiligen Variante

1.3.5 Visualisierung (AwF 050)

<x>	Auf Grundlage des Bauwerksdatenmodells werden Bilder, Videos oder VR-/AR-Anwendungen erzeugt
<x>	Verständliche Darstellung komplexer Zusammenhänge in geometrischer und visueller Form
<x>	Verbesserte Unterstützung der Entscheidungsfindung
<x>	Erhöhung der öffentlichen Akzeptanz durch verständliche Kommunikation des Bauvorhabens
<x>	Standardisierter Einsatz von Visualisierungen im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit
<x>	Direkte Verwendung von Modellen in VR und AR Technologien zur ortsunabhängigen interaktiven Kommunikation der Planungsmodelle

1.3.6 Planungskoordination und Kollisionsprüfung (insbesondere AwF 060)

<x>	Reduzierung von Risiken (z.B. Nachtragsrisiken) durch frühzeitiges Erkennen von Konflikten und Durchführung von Kollisionsprüfungen
<x>	Die Kollisionsprüfungen erfolgen für geometrische Konflikte auf Basis der 3D-Modelle, für bauphasenabhängige oder baubetriebliche Konflikte auf Basis der 4D-Modelle.
<x>	Bereitstellung einheitlicher Prüfregeln zur Bewertung und Sicherstellung der Modellqualität
<x>	Regelmäßige, vollautomatisierte Modellprüfung auf Basis abgestimmter Regelsätze
<x>	Standardisierung der modellbasierten Qualitätssicherung
<x>	Die Prüfung auf Anforderungsqualität erfolgt möglichst IT-gestützt anhand von regelbasierten Prüfungen (Einhaltung der vorgegebenen Namenskonvention, Struktur, Vollständigkeit der Attribute, Richtigkeit der Attributwerte, etc.) mit einem Model-Checker.
<x>	Die Nachverfolgung und Klärung der Arbeitsaufträge aus den modellbasierten Planungsbesprechungen erfolgt möglichst IT-gestützt mit einer Kollaborationssoftware (Issue-Management).

1.3.7 Ableitung von 2D-Plänen und Planlaufmanagement (insbesondere AwF 070, 080)

<x>	Geringerer Aufwand für Aktualisierungen bei Planungsänderungen durch Konsistenz von Modell und Plänen gewährleistet
<x>	Geringere Fehleranfälligkeit durch Ableitung der Planunterlagen aus dem Bauwerksdatenmodell
<x>	Erhöhte Qualität der Planunterlagen durch durchgängige Nutzung einer zentralen Quelle
<x>	Standardisierung der unmittelbaren Ableitung von 2D-Plänen aus 3D-Modellen für eine widerspruchsfreie Planung
<x>	Abwicklung der behördlichen und bauaufsichtlichen Genehmigungsprozesse, ggf. mit der CDE
<x>	Direkte Anbindung an die CDE des Bundes über Schnittstellen und definierte Workflows

1.3.8 5D-Modellerstellung, Ausschreibung und Abrechnung (insb. AwF 090, 100, 110, 150)

<x>	Durch die Verknüpfung der geometrischen Objekte aus den Planungsmodellen mit den Positionen aus den Kostenplänen sind 5D-Modelle zu erstellen.
<x>	Ab Lph 2 erfolgt eine Verknüpfung mit Einheitspreisen aus dem Kostenkennwertekatalog auf Ebene des Gesamtmodells Planung. Im Projektverlauf erfolgt eine Detaillierung und bei Bedarf Darstellung auf Ebene der Fachmodelle.
<x>	Ab Lph 2 werden die Kosten auf Objektebene in den Fachmodellen erfasst (vergleichbar mit Detaillierung einer Kostenschätzung/- Berechnung).
<x>	Ab Lph 3 werden die Kosten für Bauphasen und Baubetriebszustände in den 5D-Modellen berücksichtigt.
<x>	Anhand der Planungsmodelle erfolgt eine automatisierte Mengenermittlung.
<x>	Reduktion der Aufwände für Kostenschätzung und Kostenberechnung, insbesondere bei erforderlichen Aktualisierungen der Mengenermittlung im Fall von Planungsänderungen
<x>	Modellbasierte Visualisierung des Kostenverlaufs (in Verbindung mit dem verknüpften Bauablaufplan)
<x>	Plausibilisierung der Mengen für die Kostenplanung anhand der Modelle
<x>	Erhöhte Prüfbarkeit und Transparenz von LV-Positionen durch verbesserte Nachvollziehbarkeit anhand verknüpfter und visualisierter Bauteile oder Bauteilgruppen
<x>	Plausibilisierung der Mengen für die Leistungsverzeichnisse anhand der Modelle
<x>	Bereitstellung der Bauwerksdatenmodelle im Rahmen der Ausschreibung über die E-Vergabepattform für den AN

	Bau zur Information und ggf. Kalkulationsgrundlage.
<x>	Der Ausschreibungs- und Vergabeprozess für die Bauleistung erfolgt modellbasiert.
<x>	Nutzung der Modelle für die Kalkulation der Bieter im Vergabeverfahren
<x>	Kalkulation und Bepreisung des Angebots Bau, sowie Vereinbarung des vertraglich geschuldeten Bausolls auf Basis der Bauwerksdatenmodelle, die im Rahmen der Ausschreibung vom AG zur Verfügung gestellt werden
<x>	Nutzung der Bauwerksdatenmodelle zur Verifizierung der Abrechnungsmengen und zur Plausibilisierung der konventionellen Bauabrechnung
<x>	Vollständige modellgestützte Abrechnung der Bauleistungen auch unter Verwendung von Daten aus Baumaschinen und automatischen Aufmaß-Systemen

1.3.9 4D-Modellerstellung (insbesondere AwF 120,130)

<x>	Durch die Verknüpfung der geometrischen Objekte aus den Planungsmodellen mit den Aktivitäten aus dem Terminplan ist ein 4D-Modell zu erstellen.
<x>	Erhöhte Terminalsicherheit durch automatische Analyse enthaltener Unregelmäßigkeiten während der Verknüpfung von Modellelementen und Terminplan
<x>	Validierung der Bautechnologie und der Durchführbarkeit der Planung anhand des visualisierten Bauablaufs
<x>	Optimierung geplanter Arbeitsabläufe sowie Bewertung möglicher Varianten
<x>	Modellbasierte Visualisierung des Bauablaufs zur verbesserten Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.
<x>	Ableitung der Bauphasenplanung aus den Modellen
<x>	Ab Lph 2 erfolgt eine Verknüpfung mit übergeordneten Terminen je Fachgewerk auf Ebene des Gesamtmodells Planung. Im Projektverlauf erfolgt eine Detaillierung und bei Bedarf eine Darstellung auf Ebene der Fachmodelle.
<x>	Unterstützung der Planung und Optimierung von Logistikabläufen (Baustelleneinrichtung, Baustelleninfrastruktur, Bauprozesse, Verkehrsphasen, Verkehrsführung) durch den Einsatz von modellbasierten Darstellungen des Bauablaufs und Prozesssimulationen.

1.3.10 Bauwerksdatenmodell in der Bauausführung (insbesondere 140, 160, 170)

<x>	Nutzung des Modells für eine gesamtheitliche Baufortschrittskontrolle (Termine, Leistung, Kosten) als Grundlage des aktiven Projekt-Controllings
<x>	Erweiterung der Baufortschrittskontrolle von einer rein terminbezogenen Baufortschrittskontrolle hin zur gesamtheitlichen Kontrolle des Baufortschritts und Ableitung von Statusinformationen (Kosten, Termine, Qualität)
<x>	Erstellung und Weiterführung eines As-built-Modells durch Übernahme detaillierter Informationen in die Bauwerksdatenmodelle während der Ausführungsphase
<x>	Zum Abschluss der Ausführungsphase müssen alle Planungsänderungen und Informationen, z.B. verwendete Materialien und Produkte sowie ggf. Verweise auf Prüfprotokolle und weitere Dokumente im As-built-Modell auf dem aktuellen Stand eingebunden sein.
<x>	Nutzen von Schnittstellen zwischen As-built Modell und Bestandssystemen
<x>	Reduzierter Verwaltungsaufwand für Auftragnehmer durch workfloworientierte Form der Mängelerfassung und-Nachverfolgung (Mängelmanagement)
<x>	Beschleunigte Prozesse für Auftragnehmer bei Verknüpfung mit weiteren Bearbeitungsschritten (Informationsversand an beteiligte Unternehmen etc.)
<x>	Verbesserte Qualitätssicherung aus Sicht des Auftraggebers durch vereinfachte Verortung, Auswertung und Bearbeitungskontrolle vorhandener Mängel und dadurch hohe Beweissicherheit
<x>	Vollständige Dokumentation der Mängel und Ihrer Behebung

1.3.11 Übergabe/ Betreiben (insbesondere AwF 180, 190)

<x>	Erstellung einer digitalen Bauakte durch Verknüpfung des As-built Modells mit relevanten Daten und Dokumenten aus der Planungs- und Ausführungsphase, sowie zusätzlichen für Betrieb, Wartung und Instandhaltung benötigten Informationen
<x>	Durch Verwendung des Inbetriebnahme-Tools ist eine direkte Verlinkung zu den aktuellen Prozessinformationen, Formularen und Richtlinien möglich
<x>	Nutzen von Schnittstellen zwischen digitaler Bau- und Inbetriebnahmeakte, Betreibermodell und Bestansystemen
<x>	Erstellung und Pflege digital auswertbarer Objektdokumentationen für eine optimale Objekt- und Anlagenverwaltung
<x>	Verbesserung der Datenhaltung ohne Verluste bei der Archivierung beim Übergang in die Betriebsphase
<x>	Integration von Herstellerinformationen im Modell (Wartungsintervalle, Prüfungen)
<x>	Vernetzung der Bau- und Anlagenteile mit weiterführenden Objektinformationen zur Wahrnehmung der Betriebsaufgaben
<x>	Verbesserte Datengrundlagen für Umbau- bzw. Ausbaumaßnahmen

1.4 BIM-Anwendungsfälle (AWF) der DB Netz AG

Bei der DB Netz AG wurden 19 Standard-Anwendungsfälle definiert und in Steckbriefen dokumentiert:

Nr.	Anwendungsfall	Leistungsphase gem. HOAI									Betrieb
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
AwF 010	Bestandsaufnahme	■									
AwF 020	Bestandsmodellierung	■	■								
AwF 030	Bauwerksdatenmodell		■	■	■	■			■		
AwF 040	Variantenvergleiche		■								
AwF 050	Visualisierung		■	■	■	■			■		
AwF 060	Planungskoordination		■	■	■	■			■		
AwF 070	Erstellung von Plänen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
AwF 080	Freigabe- und Genehmigungsprozesse		■	■	■	■			■		
AwF 090	Kostenplanung		■	■	■	■			■	■	
AwF 100	Leistungsverzeichnisse						■				
AwF 110	Ausschreibung und Vergabe						■	■			
AwF 120	Termin- und Bauphasenplanung		■	■	■	■			■		
AwF 130	Baulogistikplanung		■	■	■	■	■	■	■	■	■
AwF 140	Baufortschrittskontrolle								■		
AwF 150	Bauabrechnung								■		
AwF 160	Mängelmanagement								■	■	
AwF 170	As-built Modell								■	■	
AwF 180	Digitale Bau- und Inbetriebnahmeakte								■	■	■
AwF 190	Betreiben, Instandhaltung -setzung										■

Tabelle 1: BIM-AWF der DB Netz AG

Folgende AWF sind durch den AN umzusetzen:

- <Text>
- <Text>


Kommentiert [A5]: Ausfüllhinweis:
Die Standard-Anwendungsfälle der DB Netz AG (im Symbio Regelwerksportal in der Arbeitsanweisung „BIM-Anwendung managen“) dienen als Hilfestellung, Grundlage sowie zur ersten Orientierung, welcher AWF im Projekt umgesetzt werden soll. Diese sind dann projekt- und gewerkespezifisch anzupassen.

2 Organisation im Projekt

Mit Einführung von BIM werden spezielle Fachkenntnisse notwendig, welche den konventionellen Funktionen des Projektleiters, Projektingenieurs etc. auf AG-Seite sowie dem Plankoordinator auf AN-Seite zugeordnet werden können. Da diese Fachkenntnisse gegenwärtig noch nicht vorausgesetzt werden können, werden in BIM-Projekten neue Rollen mit Aufgaben und Pflichten eingeführt, welche durch qualifizierte, im Projekt benannte Personen umzusetzen sind.

Die definierten Rollen sind mit geeigneten Personen zu besetzen und im BAP zu dokumentieren.

Die Abbildung 1 stellt die Arbeitsbeziehung der Projektbeteiligten beispielhaft dar. In diesem Kapitel werden die BIM-spezifischen Rollen bzgl. ihrer Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung beschrieben.

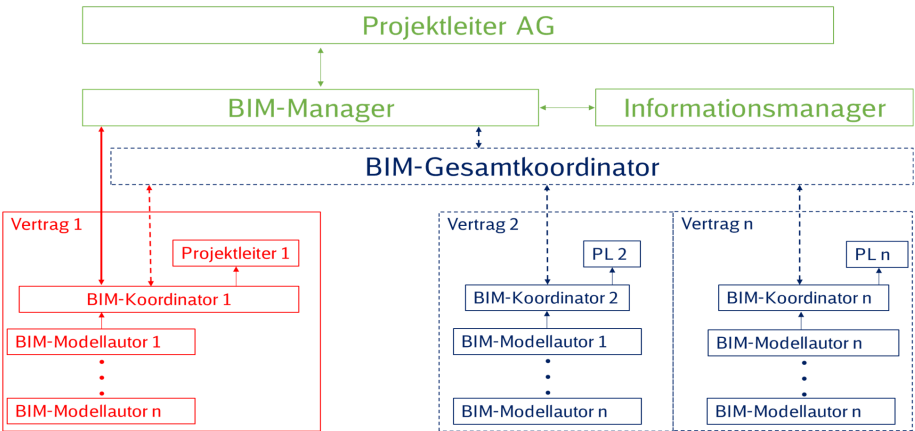

Der AN hat die Darstellung der Projektorganisation (BIM-spezifischen Rollen bzgl. ihrer Tätigkeiten und Verantwortung) im BAP zu beschreiben.

2.1 Besprechungswesen

Für das Projekt werden folgende Besprechungstermine unter Nutzung moderner Kommunikationsmedien <Text> vereinbart.

Bezeichnung	Lph.	Frequenz	Beteiligte	Ort
BIM-Projektaufaktworkshop	<Text>	<Text>	<Text>	<Text>
Besprechung und Finalisierung BAP	<Text>	<Text>	<Text>	<Text>
VDR	<Text>	<Text>	<Text>	<Text>
<Text>	<Text>	<Text>	<Text>	<Text>

Tabelle 2: Besprechungen

Kommentiert [A6]: Ausfüllhinweis: Beispielsweise: MS Teams, BIM-Lab, Videokonferenzsysteme, interaktive Whiteboards etc.

Kommentiert [A7]: Ausfüllhinweis: Bitte beachten: Die Frequenz der VDR ist mit den Angaben zur Frequenz der Planungsbesprechungen in den Vorbemerkungen der Standardleistungsbilder in Einklang zu bringen

2.2 Rollen und Verantwortlichkeiten

2.2.1 BIM-Manager (AG)

Der BIM-Manager steuert übergeordnet das Daten- und Informationsmanagement für den AG.

Er ist verantwortlich für die Umsetzung der entwickelten Strategie (BIM-Ziele) und Anforderungen an die BIM-Projektabwicklung und ist Ansprechpartner auf AG-Seite für den BIM-Prozess.

Er prüft kontinuierlich, ob die Umsetzung der AIA durch den AN erfolgt und konform zu den Zielvorgaben des Projekts ist.

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des BIM-Managers sind nachfolgend skizziert:

- Vorgabe der AIA
- Prüfung und fachliche Freigabe des BAP
- Freigabe der Lieferobjekte des AN in Bezug auf Konformität mit AIA und BAP
- Vorgaben von Anforderungen an die gemeinsame Datenumgebung (Common Data Environment kurz CDE)
- Bereitstellung und Administration der CDE
- Verwaltung der Umgebungen „veröffentlicht“ und „archiviert“ auf der CDE
- Vorgabe der Austauschformate für die eingesetzten Software-Produkte, sofern nicht bereits in den AIA festgelegt
- Vorgaben der Anforderungen an Datensicherheit, Datenkonsistenz und Datenverteilung
- Ansprechpartner für projektspezifische BIM-Themen beim AG
- Vorbereitung und Durchführung des BIM-Kick-Offs

Der BIM-Manager trägt keine Verantwortung für die fachliche Richtigkeit (z.B. Tragwerksplanung, Einhaltung von Gleisabständen) der Planungen des AN.

2.2.2 BIM-Informationsmanager (AG)

Der Informationsmanager übernimmt die Daten nach Inbetriebnahme der Anlage und ist für die Qualitätssicherung des Bauwerksdatenmodells in der Betriebsphase verantwortlich.

Dessen Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind nachfolgend skizziert:

- Frühzeitige Definition der Anforderungen für das Bauwerksdatenmodell für den Betrieb
- Bereitstellung der Daten aus dem Bauwerksdatenmodell für den Betrieb
- Einpflegen der Projektergebnisse in das Bauwerksdatenmodell im Betrieb
- Fortschreiben des Bauwerksdatenmodell während des Betriebs

2.2.3 BIM-Gesamtkoordinator (AN)

Bei Projekten, in die mehrere Fachplaner involviert sind, kann vom AG ein übergeordneter BIM-Gesamtkoordinator gebunden werden. Alternativ dazu kann einem Objektplaner die Rolle und die Aufgaben des BIM-Gesamtkoordinators übertragen werden. Der BIM-Gesamtkoordinator koordiniert die Fachplaner. Die Koordinierung erfolgt durch die Zusammenführung aller geometrischen Daten in sogenannte Koordinationsmodellen, der darauffolgenden Kollisions- und Attributsprüfung, Durchsprache der Konflikte in modellgestützten Projektbesprechungen und Nachverfolgung der Abarbeitung der Konflikte über eine modellgestützte Kommunikation.

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des BIM-Gesamtkoordinators sind nachfolgend skizziert:

- Erstellung des projektspezifischen BIM-Abwicklungsplans (BAP) in Abstimmung mit dem AG und den anderen relevanten Projektbeteiligten
- Erstellen und Fortschreiben der Modellstruktur mit dem BIM-Manager und den BIM-Fachkoordinatoren
- Koordination / Integration der Fach- und Teilmodelle in ein Koordinationsmodell
- Durchführung der Kollisions- und Attributsprüfung inklusive Dokumentation
- Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der modellgestützten Planungsbesprechungen

Kommentiert [A8]: Ausfüllhinweis:
Die Rolle des BIM-Informationsmanager ist zurzeit bei der DB Netz AG noch nicht benannt

- Durchführung der modellgestützten Kommunikation
- Termingerechte Datenübergabe der Lieferobjekte (Data Drops)
- Verwaltung der Umgebung „in Bearbeitung“ und „geteilt“ auf der CDE
- Qualitätssicherung der zu übergebenden Daten in Bezug auf Konformität mit AIA und BAP vor Übergabe in die Umgebungen „veröffentlicht“ auf der CDE
- Erster Ansprechpartner des BIM-Managers beim AN für projektspezifische BIM-Themen

2.2.4 BIM-Koordinator (AN)

Der AN trägt die Verantwortung für die Qualität der Daten eines Fachgebietes. Der BIM-Koordinator ist für die Sicherstellung der Qualität der produzierten Daten und zur Koordination der digitalen Modelldaten für ein Fach/Teilmodell verantwortlich.

Dessen Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind nachfolgend skizziert:

- Mitwirkung bei der Entwicklung des projektspezifischen BIM-Abwicklungsplans (BAP) in Abstimmung mit dem BIM-Gesamtkoordinator
- Termingerechte Datenübergabe (Data Drops)
- Teilnahme an den modellgestützten Planungsbesprechungen
- Abarbeitung der Konflikte aus der modellgestützten Kommunikation
- Verwaltung der Umgebung „in Bearbeitung“ auf der CDE
- Qualitätssicherung der zu übergebenden Daten in Bezug auf Konformität mit AIA und BAP vor Übergabe in die Umgebungen „geteilt“ auf der CDE
- Erster Ansprechpartner des BIM-Gesamtkoordinators sowie Koordination der Modellautoren seines Fachgebietes

2.2.5 BIM-Modellautor (AN)

Der BIM-Modellautor erstellt Fach -und Teilmodelle und generiert vertraglich geschuldete Projektdokumentationen.

Dessen Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind nachfolgend skizziert:

- Modellerstellung des jeweiligen Fachmodells
- Termingerechte Datenübergabe (Data Drops)
- Optionale Teilnahme an den modellgestützten Planungsbesprechungen
- Abarbeitung der Konflikte aus der modellgestützten Kommunikation

3 Prozesse

In diesem Dokument wird der Begriff „Prozesse“ synonym für Arbeitsabläufe verwendet.

3.1 Daten- und Informationsmanagement

Für die Verwendung der BIM-Methodik ist es erforderlich, alle Projektbeteiligten in hohem Maß zu koordinieren. Damit dieser Koordinierungsprozess im Projekt für alle Projektbeteiligten gewährleistet werden kann, ist eine gemeinsame Datenumgebung (Common Data Environment kurz CDE), auch Kollaborationsplattform oder Projektkommunikationsplattform genannt, erforderlich.

Das Daten- und Informationsmanagement bei BIM-Projekten der DB Netz AG erfolgt gemäß der folgenden Abbildung und ist an die ISO EN DIN 19650 angelehnt. Die im Projekt zu erstellenden Lieferobjekte durchlaufen hierbei die verschiedenen Umgebungen auf der CDE mit den beschriebenen Status.

Kommentiert [A9]: Ausfüllhinweis:
In Abhängigkeit von der eingesetzten CDE sind weitere softwarespezifische Anforderungen im BAP zu beschreiben.

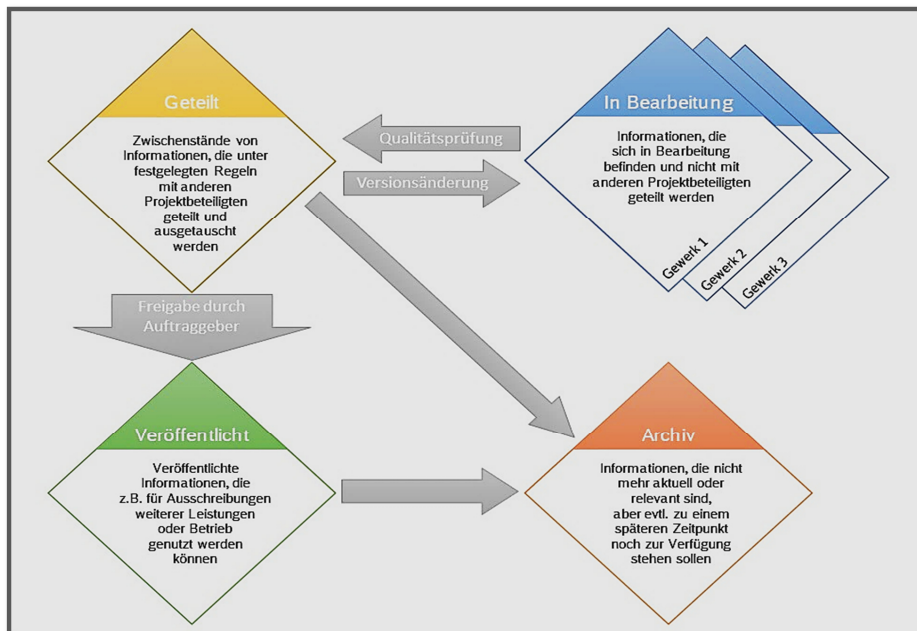


Abbildung 2: Umgebungen und Status auf der CDE

Beim Statusübergang zwischen den verschiedenen Umgebungen auf der CDE erfolgen Prozesse zur Qualitätsprüfung durch den AN und Freigabe durch den AG, die in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben sind. Bei der DB Netz AG besteht die Möglichkeit Daten im Status „In Bearbeitung“ entweder für alle sichtbar in der CDE der DB Netz AG oder in einer eigenen Softwareumgebung des AN zu führen.

3.2 modellgestützte Qualitätssicherung

Der AN hat im BAP zu dokumentieren, wie er sein internes Qualitätsmanagement durchführt. Als Mindestanforderungen hat der AN sein Qualitätsmanagement gemäß den vertraglich vereinbarten und allgemein gültigen Regelwerken sowie der AIA des AG zu erbringen.

In Bezug auf die BIM-Methodik sind hierbei folgende Besonderheiten zu beachten:

Die modellgestützte Qualitätssicherung ist zweistufig vorzunehmen.

In Stufe 1 sind die Fachmodelle und weitere Lieferobjekte zu erstellen, zu prüfen und mit den zugehörigen Anlagen an den AG zu übergeben. Diese werden vom AG stichprobenartig geprüft und ggf. freigegeben. Die BIM-Koordinatoren der Fachplaner prüfen ihre Fachmodelle kontinuierlich, jedoch spätestens vor jeder Statusänderung von „in Bearbeitung“ zu „geteilt“.

In Stufe 2 sind Koordinationsmodelle und weitere Lieferobjekte zu erstellen, zu prüfen und mit den zugehörigen Anlagen an den AG zu übergeben. Diese werden vom AG stichprobenartig geprüft und ggf. freigegeben. Hier sind Kollisionsprüfungen durchzuführen. Der BIM-Gesamtkoordinator prüft kontinuierlich die Konformität der Fachplanungen untereinander, **jedoch spätestens vor jeder Statusänderung von „geteilt“ zu „veröffentlicht“**.

Während des Qualitätssicherungsprozess sind die jeweiligen Prüfergebnisse vom AN und AG gemeinsam **gemäß den Vorgaben des AG in folgenden Dokumenten und Dateien nachvollziehbar zu dokumentieren:**

- Qualitätssicherungsberichte
- Kollisionsmatrix
- Checklisten
- BCF-Dateien

Die Prüfung auf Anforderungskonformität mit AIA und BAP erfolgt konventionell oder nach Möglichkeit IT-gestützt durch den BIM-Gesamtkoordinator. Zur Durchführung regelbasierter Prüfungen können beispielsweise Model-Checker oder Kollaborationssoftware zum Einsatz kommen. Dabei sind vorgegebene Namenskonvention, Struktur, Vollständigkeit der Attribute und Plausibilität der Attributwerte einzuhalten. Auch die Ergebnisse aus den IT-gestützten Prüfungen müssen mit Hilfe von Checklisten und Qualitätssicherungsberichten dokumentiert werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Schritte des AN von der Erstellung des Fachmodells bis zur Übergabe des Koordinationsmodells sowie weiterer Lieferobjekte an den AG.

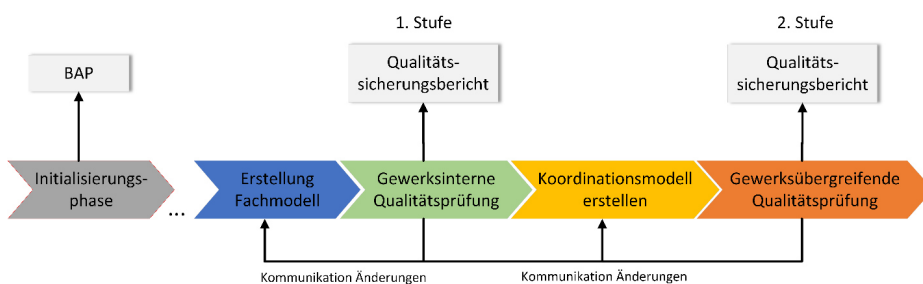


Abbildung 3: Erstellung und Qualitätssicherung Modelle durch den AN und AG bis zum Ende der Lph.

Die Initialisierungsphase dient der Abstimmung und dem Test zur modellgestützten Qualitätssicherung und kann nach Abstimmung mit dem AG vor dem eigentlichen Beginn der Modellierung durchgeführt und im BAP dokumentiert werden.

3.3 Fachmodell erstellen

Der BIM-Modellautor erstellt die Fachmodelle gemäß den Vorgaben in den AIA und im BAP und überprüft kontinuierlich die korrekte Darstellung im Modell entsprechend der Lph und dem zugehörigen Detaillierungsgrad. Die Prüfung der Fachmodelle ist möglichst IT-gestützt und regelbasiert durchzuführen.

Die Ergebnisse werden in einem Prüfbericht pro Fachmodell dokumentiert und auf der CDE abgelegt. Die Fachmodelle sind in der Umgebung „in Bearbeitung“ auf der CDE in proprietären und editierbaren Dateiformat und im offenen .ifc-Format zur Verfügung zu stellen.

Kommentiert [A10]: Ausfüllhinweis:
Das Zeitintervall für die Übergabe der Modelle vom AN an den AG muss projektspezifisch unter Kap.6.2 festgelegt werden.

3.4 Koordinationsmodell erstellen

Das Koordinationsmodell ist durch den BIM-Gesamtkoordinator im Rahmen der Qualitätssicherung zu erstellen. Mit Hilfe des Koordinationsmodells führt der BIM-Gesamtkoordinator die Kollisionsprüfung und die modellgestützte Planungsbesprechung durch. Die Ergebnisse werden in einem Prüfbericht pro Koordinationsmodell dokumentiert und auf der CDE abgelegt.

Das Koordinationsmodell und alle Fachmodelle, die in das Koordinationsmodell eingebunden sind, sind in der Umgebung „geteilt“ auf der CDE im proprietären und editierbaren Dateiformat und im offenen .ifc-Format zur Verfügung zu stellen.

Um sicherzustellen, dass alle geometrischen Informationen unterschiedlicher Quellen allgemeingültig weiterverarbeitet werden und im Koordinationsmodell lagerichtig zueinander liegen, ist es erforderlich, dass alle Quelldaten in einem einheitlichen Koordinatensystem zur Verfügung stehen, vorzugsweise im geodätischen Bezugssystem gemäß RIL 883.2500.

Kommentiert [A11]: Ausfüllhinweis:
Das Zeitintervall für die Übergabe der Modelle vom AN an den AG muss projektspezifisch unter Kap.6.2 festgelegt werden.

3.5 Kollisionsprüfung durchführen

Anhand des Koordinationsmodells führt der BIM-Gesamtkoordinator die Kollisionsprüfung durch. Das Koordinationsmodell dient der Identifikation von Konflikten, insbesondere geometrischer Kollisionen zwischen Fachmodellen der Fachplanungen sowie zwischen Fachmodellen und dem Bestand. Die Kollisionsprüfung soll möglichst IT-gestützt erfolgen. Alle Konflikte sind in einer Kollisionsmatrix gemäß den Vorgaben des AG und im offenen .bcf-Format zu dokumentieren.

Die Beschreibung des Konflikts im .bcf-Format soll mindestens folgende Inhalte haben:

- Status des Konflikts
- Verortung
- Blickrichtung
- betroffene Bauteile
- Bemerkungen
- Verantwortlicher
- Ersteller
- Zeitpunkt
- Fälligkeit

3.6 Virtual Design Review (VDR)

Das Virtual Design Review ist eine **modellgestützte bzw. modellbasierte Projektbesprechung**, welche in einem virtuellen oder physischen Projektraum durchgeführt wird. Hierbei steht der Austausch anhand des Bauwerksdatenmodells im Vordergrund, welches die zentrale Grundlage für das VDR darstellt. Das Bauwerksdatenmodell wird in der Regel über einen Computer/Smartboard/Planungstisch gezeigt und über eine Bildschirmfreigabe geteilt.

Die Themen der modellgestützten Projektbesprechung sind nicht auf das Bauwerksdatenmodell bzw. auf das Thema BIM beschränkt. Es werden sämtliche **planerischen Bedarfe** besprochen. Somit stellt die VDR einen Bestandteil der klassischen Planungsbesprechung dar, erweitert um

Kommentiert [A12]: Ausfüllhinweis:
Bitte die Arbeitshilfe „Leitfaden VDR“ im Regelwerksportal Symbio beachten

den modellbasierten Austausch mit modernen Tools und kann im Rahmen des regulären Termins abgehalten werden.

Turnus und Dauer der VDR variieren je nach Leistungsphase, Besprechungsinhalt sowie Projektgröße und sollten am Beginn jeder LPH mit dem AG abgestimmt und im BAP festgehalten werden.

In Vorbereitung der VDR sind alle relevanten Planungsmodelle vorzubereiten. Dabei sind Ansichtspunkte zu allen zu thematisierenden modellbezogenen Besprechungsthemen im Bauwerksdatenmodell zu erstellen. Die Ansichtspunkte dienen als Grundlage für die strukturierte Durchsprache im Rahmen des VDRs.

Während der VDR werden die zuvor in der Vorbereitungsphase erstellten Themenschwerpunkte und Ansichtspunkte im Modell nacheinander durchgearbeitet und diskutiert.

3.7 Freigabe durch den AG

Bei Nutzung einer CDE mit Statusverwaltung erfolgt vor dem Übergang in den Status „veröffentlicht“ die Freigabe der Lieferobjekte durch den AG. Der AG lässt sich hierfür die Dokumentation der Qualitätssicherung des AN vorlegen und prüft die Lieferobjekte stichprobenartig. Mit der Freigabe ist keine rechtsgeschäftliche Abnahme der Leistung verbunden. Für die Prozesse zur Modellerstellung und zur Freigabe der Planungshefte sind auf der CDE standardisierte Workflows hinterlegt, die zu nutzen sind.

4 Softwareeinsatz

Die Wahl der passenden Software, z.B. für die Planerstellung oder die Bauwerksdatenmodellierung wird dem AN freigestellt. Er garantiert für den verlustfreien Datenaustausch und hat dies anhand von Systemtests nachzuweisen. Diese Systemtests sind nach jeder Änderung in der Systemlandschaft zu wiederholen.

Durch die Umsetzung der BIM-Methodik ergeben sich spezifische Anforderungen an den Einsatz von Softwarelösungen. Hier wird zwischen Anforderungen der zum Einsatz kommenden

- BIM-CAD-Software zur Erstellung des Bauwerksdatenmodells,
- GIS-Software zur Erstellung des Umweltplanungsmodells,
- BIM-Koordinationssoftware bzw. BIM-Viewer zur Analyse der Planungsergebnisse und
- CDE zur zentralen Verwaltung von Projektinformationen (im Zusammenspiel mit den Umsystemen z.B. iTWO, VRI DMS)

unterschieden. Die CDE ermöglicht die zentrale Datenablage, das Zusammenspielen und das Analysieren von Daten über einen integrierten Viewer sowie die modellgestützte Kommunikation durch ein integriertes Aufgabenmanagement und die Definition des prozessualen Informationsflusses in Form von Workflows.

4.1 BIM-CAD-Software

Eine BIM-CAD-Software dient zur Modellierung geometrischer, dreidimensionaler Objekte sowie ihrer Spezifikation als Bauteile durch die Vergabe von Attributen.

Die zum Einsatz kommende BIM-CAD-Software zur Erzeugung eines Bauwerksdatenmodells kann vom AN frei gewählt werden, muss jedoch die folgenden Kriterien erfüllen:

- Dreidimensionale Modellierung im kartesischen Koordinatensystem
- Objekte können über Attribute und zugehörige Werte als Bauteile spezifiziert werden
- Lesen und Schreiben des .bcf-Formats zur modellbasierten Kommunikation, sofern ein BIM-Viewer oder eine BIM-Koordinationssoftware nicht zur Verfügung steht
- Import und Export des Schnittstellenformats .ifc
- Import der Trassierungselemente über übliche Schnittstellenformate (.landXML, .ifc, .mdb) oder Möglichkeit zur Konstruktion der Trassierungselemente (Achse und Gradienten) sowie die Überlagerung als Raumkurve

GIS-Software:

- Übergabe der GIS-Daten in die BIM-Koordinationssoftware muss gewährleistet sein
- Schnittstelle von BIM- zu GIS- sowie GIS- zu BIM-Software muss gewährleistet sein

4.2 Einsatz einer CDE / Projektkommunikationsplattform

Die vom AG vorgegebene CDE / Projektkommunikationsplattform ist im Sinne der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit über die Laufzeit des Projekts zu nutzen.

Bei Nutzung der CDE haben alle Auftragnehmer die Bringschuld, ihren aktuellen Planungsstand widerspruchsfrei und korrekt sowie zum angesetzten Zeitpunkt in der CDE zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der AN jederzeit zur eigenverantwortlichen Beschaffung der aktuellen Informationen zur Erarbeitung ihrer Leistungspakete aus der CDE verpflichtet (Holschuld).

4.2.1 Gemeinsame Datenumgebung

Die CDE wird durch den AG bereitgestellt. Für den Einsatz einer CDE gelten grundsätzlich die Anforderungen aus der ISO EN DIN 19650. Die Datenhoheit liegt beim AG. Die Einrichtung des CDE-Projektraums erfolgt durch die DB Systel GmbH sowie den entsprechenden CDE-Anbieter auf Basis

Kommentiert [A13]: Ausfüllhinweis:

In Verbundprojekten sind Softwareprodukte mit den EIU abzustimmen und ggf. projektspezifisch anzupassen.
In den BIM-Vorgaben von DB S&S werden bspw. konkrete native Datenformate gefordert.

einer Grundkonfiguration der DB Netz. Es obliegt daher dem AG den gemeinschaftlichen CDE-Projektraum vorzugeben, eine Projektraumanforderung durch ein Planungsbüro entfällt somit.

Der Zugriff auf die CDE wird durch ein vom AG vorgegebenes rollenbasiertes Nutzungskonzept geregelt. Der prozessuale Informationsfluss wird unter anderem mit Hilfe vom AG vorgegebener Standard-CDE-Workflows geregelt:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Workflow BAP-Erstellung▪ Workflow Bestandsmodell▪ Workflow Vorplanung▪ Workflow Modellierung | <ul style="list-style-type: none">▪ Workflow 2D-Planableitung▪ Workflow Entwurfsplanung▪ Workflow Genehmigungsplanung▪ Workflow Ausführungsplanung |
|---|---|

a) CDE-Anwendung / mögliche CDE-Lösungen

Die DB Netz AG stellt über den konzerninternen Dienstleister DB Systel GmbH folgende mögliche CDE-Lösungen zur Verfügung:

- Arbeitsgemeinschaft WP Squirrel, Frankfurt
- EPLASS Project Collaboration GmbH, Würzburg

Die DB Systel GmbH hat mit den Systemanbieter vertragliche Vereinbarungen über Zugänge zur IT-Anwendung (Lizenzen zur Bereitstellung der Projekträume einschließlich Betrieb, Wartung und Pflege) sowie Hotlines und Schulungen getroffen.

(Der AN beantragt seinen Zugang zur CDE der DB Netz AG in Form eines Bestellformulars und Abschluss einer verbindlichen Bestellung mit der DB Systel GmbH als konzerninterner IT-Dienstleisters des AG. Für die Nutzung der CDE bei der DB Netz AG sind die Kosten für ein Benutzerkonto abhängig von der entsprechenden Plattform unter 4.2.1 f) beschrieben. Die Abrechnung des Zugangs erfolgt monatlich durch die DB Systel GmbH direkt an den AN.)

b) Funktionsumfang der CDE

Die CDE ermöglicht

- den Zugriff aller Projektbeteiligten – Interne und Externe – auf den aktuellen Stand der Projektinformationen (Rollen- und Berechtigungskonzept)
- das Einstellen, Ablegen und Verteilen von Daten/Dokumenten (mit richtlinienkonformer Dateicodierung und nach EIU-Ablagestruktur sowie Standard-CDE-Workflows)
- die Qualitätssicherung der Daten/Dokumente durch Standard-CDE-Workflows (ggf. mit Sollvorgaben bzgl. Datum und deren Statuskontrolle sowohl für den AN und AG)
- die Uploadfunktionalitäten – Multiupload, Upload
- das Plan- und Modellmanagement mit verbindlicher Dateicodierung; CDE stellt sicher, dass nur codierungskonforme Pläne und Modelle eingestellt werden können,
- die Integration von Bauwerksdatenmodellen und deren planungsbedingten Prozesse und Abläufe inkl. Referenzierung von Dokumenten,
- grundsätzlich die Visualisierung und Koordination von Bauwerksdatenmodellen,
- projektspezifische und projektübergreifende Managementauswertungen
- Kollisionsprüfung und regelbasierte Level-Of-Information (LOI)-Prüfung

c) Support und Schulung

In den jeweiligen CDE sind Support-Hotlines für die Anwender hinterlegt. Schulungsangebote und Handbücher zu den CDE für Externe können bei der DB Systel GmbH angefragt werden.

Link/Kontakt: support.cde@deutschebahn.com

d) Informationssicherheit und Datenschutz

Der konzerninterne Dienstleister DB Systel GmbH sowie die CDE-Anbieter gewährleisten die Datensicherung und den Datenschutz.

Kommentiert [A14]: Ausfüllhinweis:
Über die Standardkonfiguration der CDE hinaus, besteht die Option, die Funktionen Kollisionsprüfung und LOI-Prüfung im Projektraum einzurichten.
Dies erhöht die Kosten der Nutzerzugänge für den Projektraum.
Die Entscheidung darüber wird durch die Projektleitung getroffen.
Beim Anbieter WP Squirrel können die genannten Funktionen nur für den gesamten Projektraum, d.h. für alle dazugehörigen internen wie externen Lizenzen, freigeschaltet werden.
Beim Anbieter Eplass ist die Funktionserweiterung auf der Ebene einzelnen Nutzerkonten möglich und kann für jeden dazugehörigen Zugang angewendet werden.
Genauere Informationen erhalten Sie unter: [sup-
port.cde@deutschebahn.com](mailto:support.cde@deutschebahn.com)

Kommentiert [A15]: Ausfüllhinweis:
Wenn die Funktionserweiterung nicht verwendet wird, bitte löschen!

e) Rollen und Rechte im Projektraum

Das Rollen- und Berechtigungskonzept der CDE-Grundkonfiguration fußt auf der Ablagestruktur. Den identifizierten Rollen wurden unterschiedliche Berechtigungen auf Ordner- und Lieferobjekt-ebene vergeben.

Rollen und Berechtigungen stellen z.B. sicher, dass die unterschiedlichen Anwendergruppen nur auf die Dokumente, Dateien und Objekte Einsicht haben, für die sie auch berechtigt sind. Auch gewährleisten sie, dass Einsichten, Prüfvermerke oder Freigaben innerhalb von Workflows nur von denjenigen Benutzern durchgeführt werden können, die gemäß Verantwortlichkeit auch dafür vorgesehen sind.

Nachfolgende Gruppen sind Ansichtsfilter auf die Ablagestruktur der CDE.

Folgende Rollen sind auf der CDE angelegt und können in einem Projekt vergeben werden:

Gruppe Admin	Gruppe AG I.N/I.NF/FE.EI	Gruppe AG I.NA	Gruppe AN Planung	Gruppe AN Bau	Gruppe AG (Extern)	Gruppe Dritte Extern	Gruppe AG Prüfer (Extern)
Fachlicher Administrator	Projektleiter AG	Informationsmanager	Projektleiter AN	Projektleiter AN	Projektsteuerer	Gast extern Dritte	BVB
Anwendungsberater	BIM-Manager	Bauherr/Anlagenverantwortlicher	BIM-Gesamtkoordinator extern	BIM-Gesamtkoordinator extern	Bauüberwacher		Prüfingenieur
Projektadministrator/Poweruser	Projektingenieur (Gruppe: KIB, VA, LST, OLA, TU, Umwelt, usw.)	Inbetriebnahmeverantwortlicher	BIM-Koordinator extern (je AN z.B. AN1, AN2, etc.)	BIM-Koordinator extern (je AN z.B. AN1, AN2, etc.)	weitere Vorhabenträger		Planprüfer
	BIM-Gesamtkoordinator intern	Anlagenbuchhalter	Fachplaner (Gruppe: KIB, VA, LST, OLA, TU, Umwelt, usw.)	Fachplaner (Gruppe: KIB, VA, LST, OLA, TU, Umwelt, usw.)	BIM-Berater		Abnahmeprüfer
	Projektkaufmann/-controller/-finanzierer/-steuerer Einkäufer	Gast intern I.NA	Gast extern Planung	Abrechner	Gast extern		
	Gast intern I.N/I.NF/FE.EI			Gast extern Bau			
			*je Auftragnehmer WF	*je Auftragnehmer WF			

Es existieren zwei verschiedene Berechtigungsstufen auf der CDE:

- S = Schreibender Zugriff (Upload/Download und Bearbeiten von Dateien)
- L= Lesender Zugriff (Download von Dateien)

f) Zugang und Kosten

Die Aufwendungen für Bestellung, Anmeldung, Abrechnung der User-Lizenzen ist mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

Kommentiert [A16]: Ausfüllhinweis:

Von den 4 Varianten ist eine Variante durch das Projekt auszuwählen und anzukreuzen! Alle anderen Varianten sollen im finalen Dokument gelöscht werden.

Variante 1

- ☐ **Arbeitsgemeinschaft WP Squirrel, Frankfurt (CDE Squirrel)**

1) Standardfunktionen

Die Kosten betragen ...€ pro schreibendem Nutzerkonto/ Monat

Die Kosten betragen ...€ pro lesendem Nutzerkonto/ Monat

Kommentiert [A17]: Ausfüllhinweis:

Zur Befüllung des Dokuments ist durch die Projektleitung AG vorzugeben, ob die CDE mit 1) Standard-Funktionen oder mit 2) einer Funktionserweiterung um Kollisions- und Attribut-Prüfung (LOI-Prüfung) eingesetzt werden soll. Dies hat bei WP Squirrel Einfluss auf die Kosten aller Nutzerkonten (intern & extern) für diesen Projektraum. Allen Nutzerkonten würden in diesem Projektraum die erweiterten Funktionen zur Verfügung stehen. Die wegfallende Option ist an dieser Stelle aus dem finalen Dokument zu löschen.

Genauere Informationen erhalten Sie unter: support.cde@deutschebahn.com

Die Kosten des CDE-Anbieters sind bei DB Systel zu erfassen und jeweils hier einzutragen.


2) Funktionserweiterung um Kollisions- und LOI-Prüfung

Die Kosten betragen ...€ pro schreibendem (funktionserweiterten) Nutzerkonto/ Monat

Die Kosten betragen ...€ pro lesendem (funktionserweiterten) Nutzerkonto/ Monat

und sind in die Nebenkosten des Angebotes einzurechnen.

Die Nutzerkonten sind nicht nur auf ein Projekt bezogen, sondern gelten für alle vom Vertragspartner bearbeiteten Projekte und der dazugehörigen Projekträume von WP Squirrel, als CDE der DB Netz AG. Abgerechnet wird immer die hochwertigste Lizenz, in dem Projekt, in dem sie anfällt. (siehe Beispiel in der Abbildung)

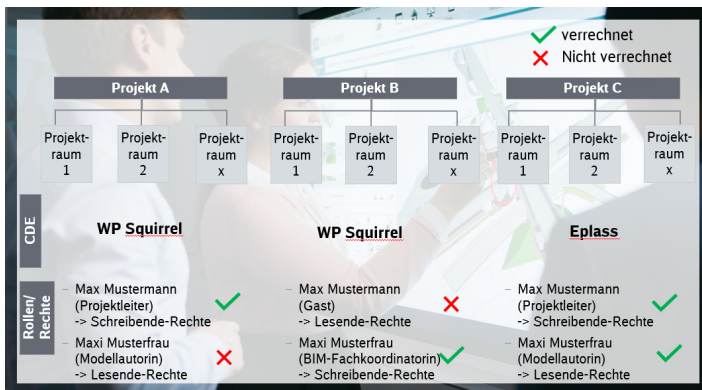

Innerhalb der CDE sind verschiedene Benutzerrollen eingerichtet. Jedem Nutzerkonto der CDE wird mindestens eine Benutzerrolle zugewiesen. Einzelnen Nutzern können auch mehrere Benutzerrollen zugewiesen werden.

Mit einem Nutzerkonto kann eine Person sowohl in mehreren Projekträumen arbeiten als auch mehrere Benutzerrollen innerhalb eines Projektraums besetzen.

Durch Annahme der Bestellung und Freischaltung durch den Systemanbieter kommt ein eigenständiges Vertragsverhältnis zwischen Auftragnehmer und der DB Systel GmbH zustande.

Jeder Vertragspartner benötigt mind. einen schreibenden Zugriff zur CDE, es sei denn es liegen sehr geringe Arbeitsanteile vor. Vertragspartner bzw. weitere Projektbeteiligte mit sehr geringen Arbeitsanteilen im Projekt können in Absprache mit der Projektleitung das Hochladen ihrer Arbeitsergebnisse in den jeweiligen Projektraum delegieren.

Darüber hinaus benötigt jedes wesentliche Gewerk innerhalb der Planungs- und Bauverträge Zugriff auf die CDE und muss mindestens einen schreibenden Zugang vorhalten.

Als wesentliche Gewerke gelten:

- Verkehrsanlagen (inkl. Schnittstelle zu OLA, LST und TK)
- Ingenieurbauwerke
- Tragwerksplanung
- Technische Ausrüstung (50 Hz, TK, Förderanlagen)
- Hochbau (Objektplanung Gebäude, Freianlagen)
- Umweltplanung
- Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung
- Projektsteuerung

Bei Zusammenhangsmaßnahmen stellt das wesentliche Gewerk (z.B. Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke) die Dokumente der untergeordneten Gewerke z.B. technische Streckenausrüstung (LST, OLA und TK) ein.

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit aller vorkonfigurierter Workflows, in der CDE der DB Netz AG, sind durch den AN mindestens folgende Benutzerrollen einzuplanen:

- 1) Die wesentlichen Gewerke innerhalb des Planungs- und Bauvertrags führen ihre internen Arbeitsprozesse in einer eigenen Softwareumgebung durch.

Kommentiert [A18]: Ausfüllhinweis:
 Eine der beiden Varianten ist durch die Projektleitung auszuwählen.
 Falls der AN seine internen Arbeitsprozesse auf einer eigenen Softwareumgebung durchführen soll, ist Variante 1) auszuwählen.
 Soll der AN seine internen Arbeitsprozesse auf der CDE der DB Netz AG durchführen, ist Variante 2) auszuwählen.
Die nicht angewendete Variante ist aus dem finalen Dokument zu löschen.

Benutzerrollen in CDE der DB Netz AG	Mind. Anzahl Nutzerkonten	Berechtigungsstufe
BIM-Gesamtkoordinator	2 x übergreifend für Gesamtprojekt	schreibend

Kommentiert [A19]: Ausfüllhinweis:
Sofern eine Funktionserweiterung der CDE um Kollisions- und LOI-Prüfung eingesetzt wird, muss die geforderte Berechtigungsstufe auf „schreibend funktionserweitert“ angepasst werden. Beim Anbieter WP Squirrel kann nur der gesamte Projekt-raum, d.h. alle dazugehörigen internen und externen Lizenzen, um die genannten Funktionen erweitert werden. Genauere Informationen erhalten Sie unter support.cde@deutschebahn.com

2) Die wesentlichen Gewerke innerhalb des Planungs- und Bauvertrags führen ihre internen Arbeitsprozesse auf der CDE der DB Netz AG durch.

Benutzerrollen in CDE der DB Netz AG	Mind. Anzahl Nutzerkonten	Berechtigungsstufe
BIM-Gesamtkoordinator	2 x übergreifend für Gesamtprojekt	schreibend
BIM-Fachkoordinator	2 x je wesentlichem Gewerk	schreibend
BIM-Modellautor	2 x je wesentlichem Gewerk	schreibend

Kommentiert [A20]: Ausfüllhinweis:
Sofern eine Funktionserweiterung der CDE um Kollisions- und LOI-Prüfung eingesetzt wird, muss die geforderte Berechtigungsstufe auf „schreibend funktionserweitert“ angepasst werden. Beim Anbieter WP Squirrel kann nur der gesamte Projekt-raum, d.h. alle dazugehörigen internen und externen Lizenzen, um die genannten Funktionen erweitert werden. Genauere Informationen erhalten Sie unter support.cde@deutschebahn.com

Der AN muss im Angebots BAP darlegen, wie viele Personen Zugriff zur CDE erhalten sollen.

Variante 2

☐ EPLASS Project Collaboration GmbH, Würzburg (CDE EPLASS)

Kommentiert [A21]: Ausfüllhinweis:
Die Kosten des CDE-Anbieters sind bei DB Systel zu erfragen und jeweils hier einzutragen.


Die Kosten betragen ...€ pro schreibendem Zugang/ Monat

Die Kosten betragen ...€ pro lesendem Zugang/ Monat

Die Kosten betragen ...€ pro schreibend (funktionserweiterten) Zugang/ Monat

und sind in die Nebenkosten des Angebotes einzurechnen.

Die Nutzerkonten sind nicht nur auf ein Projekt bezogen, sondern gelten für alle vom Vertragspartner bearbeiteten Projekte und der dazugehörigen Projekträume von Eplass, als CDE der DB Netz AG. Abgerechnet wird immer die hochwertigste Lizenz, in dem Projekt, in dem sie anfällt. (siehe Beispiel in der Abbildung)

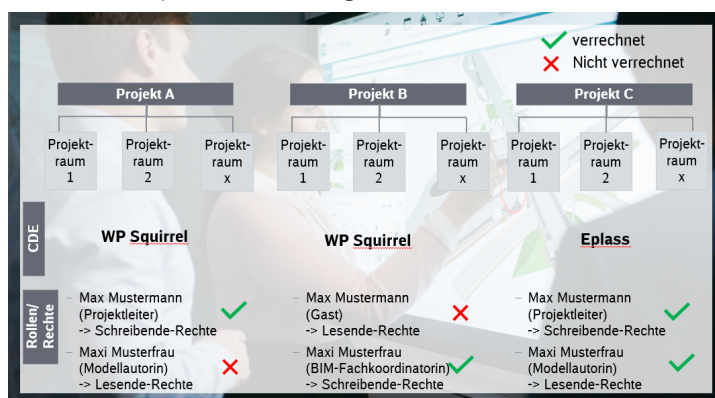

Innerhalb der CDE sind verschiedene Benutzerrollen eingerichtet. Jedem Nutzerkonto der CDE wird mindestens eine Benutzerrolle zugewiesen. Einzelnen Nutzern können auch mehrere Benutzerrollen zugewiesen werden.

Mit einem Nutzerkonto kann eine Person sowohl in mehreren Projekträumen arbeiten als auch mehrere Benutzerrollen innerhalb eines Projektraums besetzen.

Durch Annahme der Bestellung und Freischaltung durch den Systemanbieter kommt ein eigenständiges Vertragsverhältnis zwischen Auftragnehmer und der DB Systel GmbH zustande.

Jeder Vertragspartner benötigt mind. einen schreibenden Zugriff zur CDE, es sei denn es liegen sehr geringe Arbeitsanteile vor. Vertragspartner bzw. weitere Projektbeteiligte mit sehr geringen Arbeitsanteilen im Projekt können in Absprache mit der Projektleitung das Hochladen ihrer Arbeitsergebnisse in den jeweiligen Projektraum delegieren.

Darüber hinaus benötigt jedes wesentliche Gewerk innerhalb der Planungs- und Bauverträge Zugriff auf die CDE und muss mindestens einen schreibenden Zugang vorhalten.

Als wesentliche Gewerke gelten:

- Verkehrsanlagen (inkl. Schnittstelle zu OLA, LST und TK)
- Ingenieurbauwerke
- Tragwerksplanung
- Technische Ausrüstung (50 Hz, TK, Förderanlagen)
- Hochbau (Objektplanung Gebäude, Freianlagen)
- Umweltplanung
- Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung
- Projektsteuerung

Bei Zusammenhangsmaßnahmen stellt das wesentliche Gewerk (z.B. Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke) die Dokumente der untergeordneten Gewerke z.B. technische Streckenausrüstung (LST, OLA und TK) ein.

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit aller vorkonfigurierter Workflows, in der CDE der DB Netz AG, sind durch den AN mindestens **folgende Benutzerrollen einzuplanen**:

1) Die wesentlichen Gewerke innerhalb des Planungs- und Bauvertrags führen ihre internen Arbeitsprozesse in einer eigenen Softwareumgebung durch.

Benutzerrollen in CDE der DB Netz AG	Mind. Anzahl Nutzerkonten	Berechtigungsstufe
BIM-Gesamtkoordinator	2 x übergreifend für Gesamtprojekt	schreibend

2) Die wesentlichen Gewerke innerhalb des Planungs- und Bauvertrags führen ihre internen Arbeitsprozesse auf der CDE der DB Netz AG durch.

Benutzerrollen in CDE der DB Netz AG	Mind. Anzahl Nutzerkonten	Berechtigungsstufe
BIM-Gesamtkoordinator	2 x übergreifend für Gesamtprojekt	schreibend
BIM-Fachkoordinator	2 x je wesentlichem Gewerk	schreibend
BIM-Modellautor	2 x je wesentlichem Gewerk	schreibend

Der AN muss im Angebots BAP darlegen, wie viele Personen Zugriff zur CDE erhalten sollen.

Variante 3

☐ CDE-Festlegung steht noch aus

Die DB Netz AG stellt über den konzerninternen Dienstleister DB Systel GmbH folgende mögliche CDE-Lösungen zur Verfügung:

- Arbeitsgemeinschaft WP Squirrel, Frankfurt
- EPLASS Project Collaboration GmbH, Würzburg

Kommentiert [A22]: Ausfüllhinweis:

Eine der beiden Varianten ist durch die Projektleitung auszuwählen.
Falls der AN seine internen Arbeitsprozesse auf einer eigenen Softwareumgebung durchführen soll, ist Variante 1) auszuwählen.
Soll der AN seine internen Arbeitsprozesse auf der CDE der DB Netz AG durchführen, ist Variante 2) auszuwählen.
Die nicht angewendete Variante ist aus dem finalen Dokument zu löschen.

Kommentiert [A23]: Ausfüllhinweis:

Zur Befüllung des Dokuments ist durch die Projektleitung vorzugeben, ob einzelne Nutzerkonten mit einer Funktionserweiterung um Kollisions- und Attribut-Prüfung (LOI-Prüfung) eingesetzt werden sollen.
In diesem Fall muss die geforderte Berechtigungsstufe für die entsprechenden Benutzerrollen auf „schreibend funktionserweitert“ angepasst werden. Beim Anbieter Eplass kann jedes Nutzerkonto einzeln im Projektraum um die genannten Funktionen erweitert werden. Genauere Informationen erhalten Sie unter: support.cde@deutschebahn.com

Kommentiert [A24]: Ausfüllhinweis:

Zur Befüllung des Dokuments ist durch die Projektleitung vorzugeben, ob einzelne Nutzerkonten mit einer Funktionserweiterung um Kollisions- und Attribut-Prüfung (LOI-Prüfung) eingesetzt werden sollen.
In diesem Fall muss die geforderte Berechtigungsstufe für die entsprechenden Benutzerrollen auf „schreibend funktionserweitert“ angepasst werden. Beim Anbieter Eplass kann jedes Nutzerkonto einzeln im Projektraum um die genannten Funktionen erweitert werden. Genauere Informationen erhalten Sie unter support.cde@deutschebahn.com

Kommentiert [A25]: Ausfüllhinweis:

Dem Projekt ist vor der Vergabe des ersten Ing.-Vertrags nicht bekannt, welcher der zwei CDE-Anbieter den Zuschlag erhält.

Die konkret gewählte CDE-Lösung wird dem beauftragten AN später bekannt gegeben. Der Bieter erhält zur Kalkulation - auf Grundlage der durch den AG vorgegebenen höchsten ausverhandelten Zugangskosten eines CDE-Rahmenvertragspartners (obere Preisgrenze im Preisprognoseblatt der DB Systel GmbH) - ein Budget vorgegeben (siehe § 9 Vergütung Ing.-Vertrag bzw. § xx Vergütung BIM-Beratervertrag).

Budget geschätzt pro Monat ...€ für Anzahl Zugänge/ Monat übertragene Leistungen

Budget geschätzt pro Monat ...€ für Anzahl Zugänge/ Monat optionale Leistungen.

Budget geschätzt gesamt ...€ übertragene Leistungen

(Anzahl Zugänge x Anzahl Monate übertragener Leistungen=Budget geschätzt gesamt)

Budget geschätzt gesamt ...€ optionale Leistungen.

(Anzahl Zugänge x Anzahl Monate optionaler Leistungen=Budget geschätzt gesamt)

Das geschätzte Budget ist in den BIM-Ing.-Vertrag bzw. BIM-Beratervertrag zu übernehmen. Die tatsächlich anfallenden CDE-Zugangskosten werden auf Nachweis vergütet, es kommt dabei erst zu weiteren Abrechnungsforderungen, wenn das vereinbarte Budget überschritten wird.

Variante 4

☐ **CDE-Festlegung ist erfolgt - Zugang für Planer kostenfrei über das Projekt**

Der Planer erhält durch die DB Netz AG eine abgestimmte Anzahl von Zugängen zur bereits festgelegten CDE- IT-Anwendung **kostenfrei** zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung der kostenfreien Zugänge erfolgt durch das Projekt oder den beauftragten internen Dienstleister DB Systel GmbH.

g) Bestellung von Zugängen

Die Bestellung eines Zugangs zu einem Projektraum erfolgt für bahnexterne Personen über ein Antragsformular „Bestellung Zugang zur CDE für externe Nutzer“, das durch den jeweiligen Projektleiter des AG an den externen Planer übergeben wird. Der Projektleiter des AG erhält das Antragsformular mit Einrichtung des CDE-Projektraums durch die DB Systel GmbH.

Generell gibt es zwei Varianten der Abrechnung:

1. ☐ Direkte Abrechnung Planungsbüro mit DB Systel GmbH via SEPA-Lastschriftverfahren (Firmen-Lastschrift). Die Formulare zur Abrechnung „Bestellung Zugang zur CDE für externe Nutzer“ erhält das Planungsbüro entweder über den jeweiligen Projektleiter des AG oder direkt bei DB Systel GmbH unter benutzer.cde@deutschebahn.com

2. ☐ Abrechnung über das Bauprojekt der DB Netz

Kommentiert [A26]: Ausfüllhinweis:

Bei einer losweisen Vergabe sollte die Budgetschätzung auf die einzelnen Lose aufgeteilt und separiert nach Losen dargestellt werden.

Kommentiert [A27]: Ausfüllhinweis:

Ausnahmevariante bspw. bei Länderfinanzierung. Finanzierungsfähigkeit ist individuell mit dem Finanzierungsgeber abzuklären.

Kommentiert [A28]: Ausfüllhinweis:

Welches Verfahren zum Tragen kommt, hängt von der Förderfähigkeit des jeweiligen Projekts ab und ist mit dem Projektleiter des AG zu klären.

Kommentiert [A29]: Ausfüllhinweis:

Ausnahmefall siehe Variante 4

4.3 Datenaustauschformate

Nach der Arbeitsmethodik BIM werden Planungsergebnisse in Form von Daten gefordert, welche softwaregestützt gelesen, analysiert und weiterverarbeitet werden können. Um den konfliktfreien Bezug von Daten sicherzustellen, ergibt sich die Notwendigkeit, Dateiformate bzw. Datenschemata zur Übergabe der geforderten Daten vom AN zum AG festzulegen.

In der nachfolgend aufgeführten Tabelle sind beispielhaft Datenformate aufgeführt, die angewendet werden können. Die verwendeten Datenformate sind durch den AN im BAP zu dokumentieren und mit dem AG abzustimmen.

ZWECKDATENFORMAT	
Terminplanung	MPP
Kostenplanung	GAEB
Leistungsverzeichnis	GAEB
Dokumente (BAP)	XLSX, DOCX, PDF
Fach-, Koordinations-, Gesamt-, As-Built Modell	RVT, SMC, CPA, NWD, CPIXML, IFC, DWG, SHP, GDB, GeoJSON
Fachmodell LST (für Software ProSIG, ZN/ZL Planer, PlanPro Wkz)	ppxml
Digitales Geländemodell	DWG, DA 45, 49, 58 nach REB
Landschaftsmodelle (Modelle/Daten Dritter) /Geobasisdaten	SHP, NAS, XML, DWG, SHP, GDB, GeoJSON
IVL-Pläne	DWG, GeoTIFF, PDF
Gleisnetzdaten	landXML
Trassierungsdaten	landXML, MDB, DGN, VERM.ESN
Punkte (tachymetrisch)	DA45 nach REB
Punktwolken	Stationäres Laserscanning: E57 TXT, XYZ, ASC, LAS
Texturierte Flächenkörper	OBI, VRML
Visualisierung	RVT, 3D DWG, PLN, DGN, COLLADA, CityGML
Orthofotos	TIFF und Einpassdatei TGW, JPEG und Einpassdatei JGW, ECW
Kommentierte Ansichtspunkte	BCF
Pläne/ Konstruktionszeichnungen	DWG, PDF, GeoTIFF
Statik	ANS, XML
Gutachten (z.B. Baugrund, Schall)	DOCX, DWG, XLS, CSW
GIS -Daten Dritter	SHX, SHP, XML
Digitale Bauakte für IBN	IFC, DWG, DOCX, PDF, JPEG

Tabelle 3: Nicht abschließende Auflistung möglicher Datenformate

Kommentiert [A30]: Ausfüllhinweis:
Die aufgeführten Datenformate sind projektspezifisch anzupassen müssen stetig ergänzt und aktuell gehalten werden.

4.4 Nomenklatur

Zur eindeutigen Identifizierung von Modellen ist eine Nomenklatur der Modelle vorzunehmen. Die Namenskonvention ist nachfolgend beispielhaft dargestellt und richtet sich nach der Grundkonfiguration der CDE.

Beispiel	geografische Spezifikation								Dokumente-Spezifikation													
	ABS	-	3432	-	8570	-	AG	-	LST	--	2D	-	3	-	T	-	DBN	-	XYZ	-	001	-
Ebene	Ebene 01		Ebene 02		Ebene 03		Ebene 04		Ebene 05		Ebene 06		Ebene 07		Ebene 08		Ebene 09		Ebene 10		Ebene 11	
Code-Länge	2-10 Z.	1-40 Zeichen	2-10 Z.	1-40 Zeichen	2-10 Z.	1-40 Zeichen	2-6 Z.	1-40 Zeichen	2-3 Z.		2-3 Z.		1 Zeichen	1 Z.	1-40 Zeichen	2-3 Z.	1-40 Zeichen	1-25 Zeichen	3 Zeichen			
Beschreibung	Projektbezeichnung		Örtlichkeit 1 (z.B. Streckennummer, Abschnitt, etc.)		Örtlichkeit 2 (z.B. Kilometrierung, Anlagennummer)		Ersteller (Vertrag)		Gewerk / Fachmodell		Dokumentenart		Leistungsphase		Zustand		Anlagenbetreiber		Freies Textfeld		Lfd. Nummer ²	
Hinweis	Bitte anpassen		Bitte anpassen		Bitte anpassen		Bitte anpassen		Nicht anpassbar		Nicht anpassbar		Nicht anpassbar		Anpassbar aber nicht angepasst		Anpassbar aber nicht angepasst				Nicht anpassbar	
Codes (Bsp.)	EU-Dorf	EU-Dorf	6017	Strecke 6017	8570	Kilometer 8570-8577	UE	Übergreifend	AD	Anlagen Dritter	2D	2D-Plan	0	Übergeordnet	U	Übergreifend	DBN	DB Netz			001	001
	ABS	ABS	6106	Strecke 6106	8578	Kilometer 8578-8590	AG	Auftraggeber	BG	Baugrund	FM	Fachmodell	1	Grundlagenermittlung	B	Bestand	SuS	DB Station&Service			002	002
		NBS		Neubaustrecke			Bau PI	AN Planer	BSA	Bahnstromanlagen (DB Energie, 110 kV)	KM	Koordinationsmodell	2	Vorplanung	E	Erhalt des Bestandes	DBE	DB Energie			003	003
									BUE	Bahnübergang	GM	Gesamtkoordinationsmodell	3	Entwurfsplanung	N	Neubau	UE	Übergreifend			004	004
									DG M	Digitales Geländemodell	BD	Baustellendokumentation	4	Genehmigungsplanung	R	Rückbau	DBI	DB Immobilie			005	005
									EEA	Elektrische Energieanlagen (50 Hz)	BZ	Bautechnologie/-zustände	5	Ausführungsplanung	T	Temporär					006	006
									FM	Flächenmanagement	KP	Kostenplan	6	Ausschreibung	V	Variante					007	007
									HB	Hochbau	MM	Mängelmanagement	7	Vergabe	Z	Bauzwischenstand					008	008
									KIB	Ingenieurbauwerke	QS	Qualitätssicherungsbericht	8	Objektüberwachung							009	009
									KTb	Kabeltiefbau	TP	Terminplan	9	Objektbetreuung und Dokumentation							010	010
									LS	Schall-/Lärmschutzplanung	VI	Visualisierung									011	011
									LST	Leit- & Sicherungstechnik	ANZ	Anzeige									...	...
									MT	Maschinentechnik	AST	Aufgabenstellung (StuS (Asu)									999	999
									OB	Oberbau	AVF	Altlastenverdachtsflächen										
									OLA	Oberleitung (16,7 Hz)	BAP	BAP-Dokument										
									TB	Tiefbau	BAS	Betriebliche Aufgabenstellung (BAsst)										
									TK	Telekommunikationsanlagen	BBE	Baufagesbericht										
									TRA	Trassierung (Achsen)	BBP	Baubetriebsplanung										
									TWP	Tragwerksplanung	BBU	Baufagebuch										
									UE	Übergeordnet	BD M	Bodendenkmäler										
									UW	Umweltplanung	BER	Bericht										
									VA	Verkehrsanlagen	BET	Betra-Anträge, Betren										
									VM	Vermessung	BO V	BoVEK										
									ZL	Zuglenkung	BTP	Baublaufplan										
									ZN	Zugnummer	BW D	Bauwerksdokumentation (Bauwerksbuch, Bauwerksverzeichnis...)										
									BLI	Blitzschutz	DO K	Dokumentation										
									BRA	Brandschutz	GE N	Genehmigungen (z. B. parl. Befassung, Planfeststellungsbeschl...)										
									GA	Gebäudeautomation	GU T	Gutachten										
									HLS	Heizung/Lüftung/Sanitär	KMI	Kampfmittel										
									LK	Leitungskreuzungen (mit Leitungen Dritter)	MB S	Machbarkeitsstudie										
									SB	Straßenbau	MT P	Meilensteinsterminplan										
									VW	Verkehrswasserbau	NW	Nachweis										
											OB G	Ortsbegehung										
											OE A	Öffentlichkeitsarbeit										
											OR C	Beteiligte, Organigramme, Organisation										
											PAB	Palamentarische Befassung										
											PR O	Protokoll										

									QA	Qualifizierte Aufgabenstellung DB								
									S	Energie (QuAst)								
									RIL	Regelwerke								
									RO									
									V	Raumordnungsverfahren								
									SG									
									K	SiGeKo- Pläne								
									ST	Stellungnahmen								
									SV	Schiffverkehr								
									UIG	Unternehmensinterne Genehmigung								
									UVP	Umweltverträglichkeitsprüfung								
									VAS	Verkehrliche Aufgabenstellung (VAs)								
									VER	Vermessungsunterlagen								
									VO	Vorlagen								
									R									
									ZD	Zusatzdokument								
									ZIE	Zustimmung im Einzelfall								
									VPH	Vorplanungsheft								
									EPH	Entwurfsplanungsheft								
									GP									
									H	Genehmigungsplanungsheft								
									APH	Ausführungsplanungsheft								
									QG	Quality Gate								

Tabelle 4: CDE-Datei-Namenskonvention

Hinweise:

- Die Dateinamenskonvention ist verbindlich für alle Dokumente anzuwenden!
- Ausgenommen sind Bestandsunterlagen (P0.2) und Dokumente der Kaufmännischen Akte (K.)
- Ebene 1 bis 11 werden mit einem Unterstrich "_" voneinander getrennt.
- 2Die laufende Nummer im Dateinamen wird manuell durch den Nutzer gepflegt.

Zusatzinformation zur Versionierung:

1. Das Führen der Versionsnummer ist eine systemische Aufgabe.
2. Die Versionsnummer wird automatisch vom System erzeugt und wird nicht in Dateinamen geführt.
3. Innerhalb der CDE muss die Versionsnummer als Eigenschaft zur Datei erkennbar sein.
4. Beim Export aus dem System soll die Versionsnummer als Eigenschaft zur Datei erkennbar sein.
5. Der Nutzer kann Versionsnummern nicht manuell erzeugen oder pflegen.

5 Anforderungen an Struktur, Daten und Modelle

Dieses Kapitel beschreibt die Anforderungen des AGs an die durch den AN zu liefernden Modelle, sonstigen Daten und an deren Strukturierung. Der AN muss die Einhaltung aller im Folgenden beschriebenen Anforderungen sicherstellen.

Um Daten softwaregestützt auszuwerten und weiter verwerten zu können, muss eine standardisierte Struktur der Daten geschaffen werden. Für die DB Netz AG erfolgt dies über die Vorgabe des semantischen Objektmodells (siehe **Anlage semantisches Objektmodell**).

5.1 Anforderungen an Modelle

5.1.1 Allgemeine Anforderungen

Ein grundlegendes Ergebnis der Methodik BIM ist das Bauwerksdatenmodell, welches in den Folgeprozessen der BIM-Methodik für verschiedene Zwecke digital ausgewertet und weiterverarbeitet wird. Es besteht aus einer Zusammenführung unterschiedlicher objektorientierter Daten und der geometrischen Repräsentation im dreidimensionalen Raum (attribuiertes 3D-Modell).

Die Bauwerksdatenmodelle stellen das zentrale Element in jedem BIM-Projekt dar. Die Erstellung der Bauwerksdatenmodelle liefert die Grundlage zur Durchführung aller weiteren BIM-Anwendungsfälle. Anders als bei der konventionellen Planung, bei der die Planung auf 2D-Plänen abgebildet wird, setzt die BIM-Methodik auf die Abbildung der Objekte in **3D-Modellen**. Diese 3D-Modelle werden zusätzlich mit Informationen in Form von Attributen angereichert.

Durch eine Verknüpfung der Objekte mit den Aktivitäten aus dem Bauablaufplan entstehen **modellbasierte Darstellungen des Bauablaufs (4D-Modell) und der Baulogistik**. Ein Zweck der Entwicklung von modellbasierten Darstellungen des Bauablaufs ist der Nachweis dessen Umsetzbarkeit sowie die Unterstützung bei der Bewertung und ggf. Optimierung geplanter Arbeitsabläufe sowie bei der Untersuchung möglicher alternativer Varianten.

Ab Lph	Struktur Bauablaufplan	Beispiel Vorgang	Verknüpfung: Attribut (projektindividuelle ID)	Objektebene	Beispiel Modellobjekt
1	1 Bauwerk/Anlage	EU	Bspw.: Bauwerk_Stationierung_Gleis_Baueitl_Bauphase...	Bauwerk	Brücke
2	1.1 Bauphase	Ing.Bau	Bspw.: Bauwerk_Stationierung_Gleis_Baueitl_Bauphase...	Bauteilgruppe	Überbau Massivbrücke
2	1.1.1 Prozess	Einbau Überbau	Bspw.: Bauwerk_Stationierung_Gleis_Baueitl_Bauphase...	Bauteilgruppe	Überbau Massivbrücke
3	1.1.1.1 Unterprozess	Überbau einschleppen	Bspw.: Bauwerk_Stationierung_Gleis_Baueitl_Bauphase...	Objekt	Endquerräger Spannbeton
5	1.1.1.1.1 Tätigkeit	Verschub durchführen	Bspw.: Bauwerk_Stationierung_Gleis_Baueitl_Bauphase...	Objekt	Endquerräger Spannbeton
8	1.1.1.1.1.1 ... (optional erweiterbar)	... (optional erweiterbar)	Bspw.: Bauwerk_Stationierung_Gleis_Baueitl_Bauphase...	... (optional erweiterbar)	... (optional erweiterbar)

Abbildung 4: Schematisches Beispiel zum Vorgehen bei der modellbasierten Darstellung des Bauablaufs

Durch die Verknüpfung der Objekte mit Aktivitäten aus dem Bauablaufplan und Kosteninformationen aus den Kostenplänen entstehen **modellbasierte Darstellungen der Baukosten (5D-Modell)**. Mit Hilfe der modellbasierten Darstellungen der Baukosten können die Kosten über den Projektverlauf visualisiert werden und so Auswirkungen der Planungsvariante auf die Mittelabflussplanung aufgezeigt werden.

Die Modelle werden zudem nach ihrem Inhalt und Umfang unterschieden. In der Modellplanung wird zwischen Gesamtmodell, Fachmodellen, Teilmodellen und Koordinationsmodellen unterschieden.

Das **Gesamtmodell** besteht aus den koordinierten Fachmodellen der verschiedenen Fachplaner. **Fachmodelle** sind gewerkspezifische 3D-Modelle. Ein Fachmodell kann aus einem oder mehreren **Teilmodellen** bestehen. Die Fachmodelle werden regelmäßig in einem **Koordinierungsmodell** und nach erfolgreicher Kollisionskontrolle im Gesamtmodell zusammengefasst.

Die vorgenannte Unterteilung in Modellarten ermöglicht eine parallele sowie leistungsfähige Bearbeitung der Fach- und Teilmodelle. Das regelmäßige Zusammenspielen der Fachmodelle im Koordinationsmodell fördert die Abstimmungsprozesse und sichert die Konsistenz des Gesamtmodells.

Bei mehreren Projektabschnitten mit unterschiedlichen AN, ist die Schnittstellenkompatibilität an der Projektabschnittsgrenze sicherzustellen.

Bei der Erstellung von Modellen und Objekten ist zu berücksichtigen, dass **ein dem Verwendungszweck angemessener Modelldetaillierungsgrad** angewendet wird. In Abstimmung zwischen AN und AG kann im BAP die Definition von Modelldetaillierungsgraden erfolgen. Typischerweise steigert sich die Detaillierung der Geometrie und Informationstiefe der Attribute im Laufe der

Kommentiert [A31]: Ausfüllhinweis:
Bitte beachten, dass die unten aufgeführten Anforderungen an die Modelle im finalen Dokument mit den ausgeschriebenen Leistungsbildern übereinstimmen. (Bspw. die Leistungen 4D- und 5D-Planung)

Projektabwicklung. Dabei kann die Planungs- und Darstellungstiefe verschiedener Objekte innerhalb von Modellen durchaus variieren und muss daher entsprechend detailliert spezifiziert werden.

Der Modelldetaillierungsgrad muss entsprechend der nachfolgenden Anforderungen an die Modelle in den jeweiligen Projektphasen eingehalten werden.

Toleranzwerte in den Modellen sind zwischen AG und AN in jedem Projekt unter Berücksichtigung der Leistungsphasen und der Anwendungsfälle abzustimmen und im BAP zu dokumentieren.

Die Modellierung soll möglichst mit parametrischen Objekten erfolgen, um bei Änderungen nur die Parameter und nicht das komplette Modell anpassen zu müssen. Die Objekte sind als Volumenkörper zu modellieren, um Mengen ermitteln zu können. Die Anzahl verschiedenartiger Objekte zur Modellierung der Bauteile soll sich entsprechend der über die Leistungsphasen fortschreitenden Detaillierung der Planung vermehren. Die Gleisanlage ist als Volumenkörpermodell aus den georeferenzierten Achsdaten und standardisierten Querschnitten des Gleiskörpers gemäß RIL 800 zu entwickeln. Der Erdbau ist so zu modellieren, dass eine automatische Auswertung der Erdaushub und -auftrags möglich ist. Rückbaumaßnahmen sind bei der Modellierung zu berücksichtigen.

Die Modelle müssen in einem, der Planungsaufgabe und Leistungsphase angemessenen, geringem Detaillierungsgrad im Autorensystem visualisierbar sein. Zur Anfertigung von Visualisierungen mit hohem Detaillierungsgrad müssen die Modelle bei Bedarf an spezielle Visualisierungsanwendungen übergeben werden können.

Alle Modelle müssen neben den proprietären Formaten aus dem Autorensystem auch möglichst verlustfrei in einem offenen Dateiformat übergeben werden.

Die Modelle müssen eine automatisierte Auswertung der Attribute sowie der modellbasierten Mengen zulassen.

Durch die Verknüpfung mit den zugehörigen Kosteninformationen aus den Kostenplänen muss eine der Leistungsphase entsprechend detaillierte Visualisierung des Kostenverlaufs möglich sein.

Die Bauteile müssen mit spezifischen Objekten in einem der Planungsaufgabe in dieser Projektphase angepassten Detaillierung in einem einheitlichen Koordinatensystem (abhängig von verfügbaren Daten) erstellt werden und spätestens am Ende der Projektlaufzeit in das geodätische Bezugssystem gemäß Ril 883.2500 transformiert werden. Abmessungen sowie geometrische Eigenschaften und Positionen der Objekte müssen hierbei eindeutig bestimmt sein.

Kommentiert [A32]: Ausfüllhinweis:
Toleranzwerte mit AG und AN abstimmen und im BAP festlegen.

5.1.2 Anforderungen an die Grundlagenermittlung und Bestandsmodellierung

Die Daten der Bestandsaufnahme, welche zur Erstellung des jeweiligen fachspezifischen Bestandsmodells verwendet wurden, sind vom AN zu übergeben und mit dem jeweiligen Bestandsmodell zu verknüpfen. Mit den jeweiligen fachspezifischen Bestandsmodellen sind außerdem alle weiteren verfügbaren 2D-Bestandsunterlagen, wie z.B. Bauwerkspläne oder Leitungspläne zu verknüpfen.

Das zusammengesetzte Bestandsmodell muss folgende Fachmodelle enthalten mit den entsprechenden Mindestanforderungen:

Kommentiert [A33]: Ausfüllhinweis:
Das zu verwendende Georeferenzsystem ist projektspezifisch festzulegen und im BAP zu dokumentieren.

Kommentiert [A34]: Ausfüllhinweis:
Fachmodelle und die unten genannten dazugehörigen Mindestanforderungen sind projektspezifisch auszuwählen.

- Digitales Geländemodell (DGM)
- Baugrundmodell
- Leitung und Kreuzung (Spartenmodell)
- Flächenmanagement (Grundeigentum)
- Bebauung (Gebäude)
- Geobasisdaten (in mehreren Teilmodellen)
- Fachmodell Umwelt - Teilmodell Bestand
- Schienenverkehrsanlagen inkl. Unterbau, Entwässerung und Kabelführungssysteme
- Straßenverkehrsanlagen inkl. Unterbau und Entwässerung
- Ingenieurbauwerke
- Ausrüstungsanlagen (LST, OLA)
- <Text>

Mindestanforderungen:

▪ **Digitales Geländemodell (DGM)**

Das digitale Geländemodell (DGM) soll als dreiecksvermaschte Beschreibung der Geländeoberfläche, ohne künstliche Einbauten, erstellt werden. Im Bereich der künstlichen Einbauten ist das DGM auszusparen, um im Rahmen der Koordination des Bestandsmodells (Kollisionsprüfung) keinen Konflikt zu verursachen.

▪ **Baugrundmodell**

Das Fachmodell Baugrund ist geometrisch in mehrere Teilmodelle (Zusammenfassung von Fachobjekten; äquivalent zum Begriff „SUB-Fachmodell“) gegliedert, die anhand von thematischen Gruppierungen gebildet werden. Eine weitere Unterteilung in Modellbereiche (räumliche Abgrenzung, z. B. anhand von Planungsabschnitten oder Teilprojekten) wird in Absprache mit dem AG vorgenommen.

Folgende Teilmodelle sind zu erstellen und zu übergeben:

Teilmodell Baugrundaufschlüsse

- alle aus geotechnischer Sicht für die Fragestellung relevanten Aufschlüsse (Projektaufschlüsse + Altaufschlüsse), dazu sind die Bodenschichten in den Aufschlüssen/ Bohrprofilen, mit einem Durchmesser von bspw. 2 Metern, georeferenziert und punktuell im Modell umzusetzen
- Fachobjekte = Aufschlussintervalle

Teilmodell Baugrundsichten

- gutachterliche Unterteilung in Baugrundsichten
- Fachobjekte = Baugrundsichten
- Räumliche Interpretation der Baugrundaufschlüsse (i. d. R. punktuelle Informationen) unter Zuhilfenahme von einer oder mehreren durch den AN gewählten Interpolationsmethoden
- Erstellung des Teilmodells folgend dem geotechnischen Bericht (basierend auf geologischen Entstehungsprozessen / Stratigraphie, Erkundungen, Laborversuchen...).

Teilmodell Homogenbereichssichten

- gutachterliche Unterteilung in Homogenbereiche
- Fachobjekte = Homogenbereichssichten
- Zusammenfassung der Baugrundsichten nach VOB/C
- Alle nach VOB/C begutachteten Gewerke als gesonderte Fachobjekte
- [der AN identifiziert, welche Gewerke nach VOB-ATV zu berücksichtigen sind und integriert diese in das Sub FM als gesonderte Fachobjekte]

Teilmodell Grundwasser

- Geometrische Darstellung der relevanten Bemessungswasserstände als Flächen ohne Attribuierung

Bei der Projektrealisierung durchläuft das Fachmodell Baugrund aufgrund von zusätzlichen Erkenntnissen (z.B. neue Feld- oder Laborversuchskampagnen) verschiedene Entwicklungsstufen, bei denen die Teilmodelle mit weiteren Fachobjekten angereichert werden (z.B. neue Aufschlüsse) und die Semantik (Attributwerte, vgl. **Semantisches Objektmodell**) aktualisiert wird im Sinne einer zunehmenden Granularität eines Modells.

▪ **Leitung und Kreuzung (Spartenmodell)**

Pro Bauwerk/Objekt (Strom, Wasser, Gas etc.) ist vom AN auf Basis vorliegender Bestandsdaten ein Teilmodell mit den im Planungsgebiet befindlichen Sparten zu erstellen. Die Summe der Teilmodelle aller Bauwerke/Objekte ergibt das Fachmodell Leitung und Kreuzung.

Abhängig von der Genauigkeit der zur Verfügung stehenden Grundlagen ist die Verlässlichkeit der Lageinformation an den Modellobjekten zu kennzeichnen (über ein Attribut **und/oder** über einen Lagekorridor um die Leitung, der die potenzielle Lagegenauigkeit abdeckt). Die Entscheidung der Kennzeichnung erfolgt in Abstimmung mit dem AG.

Kommentiert [A35]: Ausfüllhinweis:
Relevante Fachmodelle bitte auswählen und ggf. projektspezifisch anpassen

Kommentiert [A36]: Ausfüllhinweis:
Zur Erstellung des Fachmodells Baugrund ist grundsätzlich die Handlungsempfehlung „Fachmodell Baugrund“ zu beachten (im Symbio Regelwerksportal in der Arbeitsanweisung „BIM-Anwendung managen/ Arbeitshilfen“).

Kommentiert [A37]: Ausfüllhinweis:
entsprechend relevante Teilmodelle projektspezifisch auswählen bzw. löschen

Kommentiert [A38]: Ausfüllhinweis zum SOM:
In Bezug auf das Fachmodell Umwelt und Fachmodell Baugrund sind hier Attribute/Informationen zu ergänzen und mit dem AG abzustimmen.

Kommentiert [A39]: Ausfüllhinweis:
Sofern möglich, kann hier spezifiziert werden, welche Leitungsarten berücksichtigt werden sollen.

■ Flächenmanagement (Grundeigentum)

Auf Basis vorliegender Kataster- und Eigentümerdaten ist vom AN ein Modell der bestehenden Grundeigentumsverhältnisse zu erstellen, um die Aspekte der modellbasierten Grunderwerbsermittlung im Rahmen der Variantenuntersuchung sowie der Genehmigungsplanung damit abbilden zu können. Hierzu sind die georeferenzierten 2D-Katasterdaten (umgrenzte Grundstücksflächen mit Nummer) in einem 3D-Modell abzubilden und die jeweiligen Flächen mit den ALKIS-Eigentümerdaten in Form von Attributen anzureichern.

Die Eigentümerdaten sind aus datenschutzrechtlichen Gründen zu anonymisieren.

■ Bebauung (Gebäude)

Auf Basis, der bei den Landesvermessungsämtern erhältlichen 3D-Gebäudedaten ist vom AN ein Modell der Bestandsbebauung zu erstellen, um dies mit der Planung verschneiden und somit Eingriffe in die bestehende Bebauung abbilden zu können.

Die Gebäudedaten sind in zwei Detaillierungsgraden erhältlich: Level of Detail (LoD) 1 (oberirdischen Gebäude und Bauwerke ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Dachformen in Form einfacher Klötzchen mit Flachdach) und LoD2 (beinhaltet zusätzlich standardisierte Dachformen entsprechend der tatsächlichen Firstverläufe).

Für das Bestandsmodell sind Gebäudedaten im Detaillierungsgrad LoD 2 zu verwenden. Diese sind bei den Landesvermessungsämtern zu beschaffen. Abhängig vom Bundesland stehen diese Daten kostenlos oder zum Ankauf zur Verfügung.

Um einen Verlust von Attributen oder Geometrien zu vermeiden, sind die Daten vorzugsweise im .CITYGML oder .DWG-Format abzufragen.

■ Geobasisdaten/ Umweltplanung

Als weitere Planungsgrundlage stehen diverse Geobasisdaten öffentlich zur Verfügung. Diese werden von verschiedenen Bundes- und Landesbehörden sowie öffentlichen Anbietern zum Download bereitgestellt. Im Bestandsmodell sind digital verfügbare Informationen zum Bestand aus GIS-Systemen in den entsprechenden Teilmodellen mitabzubilden, um diese im Rahmen der Variantenuntersuchung (Vorplanung) und Genehmigungsplanung mit der Planung zu verschneiden und somit den Umfang der Betroffenheiten zu ermitteln.

Das **Fachmodell Umwelt** ist in **Teilmodelle** gegliedert:

- Teilmodell Umwelt Bestand (Lph 1-2):
In diesem Teilmodell sind Objekte zusammengefasst, die als Grundlage bzw. (GIS-)Bestandsdaten zu Projektgebiet vorliegen z.B. Objekt „Schutzgebiet“, „Schützenswertes Gebiet“, „Überschwemmungsgebiet“ (vgl. SOM)
- Teilmodell Umwelt Fachdaten (Lph 2-4):
In diesem Teilmodell sind Objekte zusammengefasst, die im Planungsverlauf erhoben werden oder in die umweltfachliche Bewertung mit einfließen z.B. Objekte „Biotoptypen“, „Artenfundpunkte“, „SG Boden“ (vgl. SOM)
- Teilmodell Umwelt Planung (Lph 3-4):
In diesem Teilmodell sind die umweltfachlichen Planungsinhalte zusammengefasst z.B. Objekt „LBP Konflikt“, „LBP Maßnahme“ (vgl. SOM)
- Teilmodell Schall/Erschütterung (zurzeit in Bearbeitung)

Es sind nur die Objekte innerhalb des vom AG und AN abgestimmten/ festgelegten Untersuchungsgebietes zu übergeben. Ob bei der Grundlagenermittlung ein Teilmodell Umwelt Fachdaten benötigt wird, ist projektspezifisch festzulegen, je nach Anforderung und Datenbestand.

Bei Einbindung von Daten Dritter, beispielsweise Behörden, amtliche Kartierdaten etc., ist die Attribuierung im SOM zu erweitern.

Im Laufe des Projektes wächst der Informationsgehalt des Fachmodells Umwelt. Dies ergibt sich durch das Fortschreiben aufgrund zusätzlicher Erkenntnisse (z.B. Kartierungen) oder der Zunahme

der Planungstiefe. So können beispielsweise Objekte wie „Biotop“ mit zusätzlichen Attributen versehen werden. Das Fortschreiben der Attribute kann innerhalb einer Leistungsphase oder durch den Übergang in eine neue Leistungsphase erforderlich werden.

Für das Einpflegen der LBP-Maßnahmen in das FINK-System ist eine separate Datei nach den FINK-Vorgaben zu erstellen. Aufgrund unterschiedlicher technischer Anforderungen innerhalb der Systeme FINK und des SOM, kann das Objekt LBP Maßnahme nicht ohne zusätzliche Anpassung der Attributnamen in das FINK-System eingebunden werden.

Das Gesamtmodell Umweltplanung bzw. die einzelnen Teilmodelle sind 2D- oder/ und 3D-Modelle, je nach Anwendungsfall, Datengröße und projektspezifischen Anforderungen.

▪ **Schienenverkehrsanlagen inkl. Unterbau, Entwässerung und Kabelführungssysteme**

Die bestehende Gleistrasse ist im Bestandsmodell auf Basis der zugrunde liegenden Bahngeodaten und Bestandsinformationen georeferenziert darzustellen. Sofern keine gegenteiligen Bestandsdaten vorliegen, ist die Trasse parametrisch mit den Regelprofilen nach Ril 800 zu modellieren. Vorliegende Bestandsdaten zum Trassenunterbau, zu den Entwässerungseinrichtungen und zu den Kabelführungssystemen sind als 3D-Objekte im Bestandsmodell zu modellieren. Hierfür sind jeweils eigene Teilmodelle zu erstellen.

▪ **Straßenverkehrsanlagen inkl. Unterbau und Entwässerung**

Die bestehenden Straßentrassen inkl. Unterbau und Entwässerungseinrichtungen sind im Bestandsmodell auf Basis der vorliegenden Bestandsdaten georeferenziert darzustellen. Hierbei ist das Bestandsmodell wiederum in mehrere Teilmodelle zu untergliedern (Bspw.: pro Straße und nach Teilgewerk).

Der Straßenaufbau soll an planungsrelevanten Stellen aus mehreren Schichten (Frostschuttschicht, Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht o.ä.) bestehen, sofern die vorliegenden Bestandsdaten dies ermöglichen.

▪ **Ingenieurbauwerke**

Bestehende Ingenieurbauwerke sind als eigenständige Teilmodelle auf Basis der vorliegenden Bestandsdaten georeferenziert darzustellen.

Die Modellierung der Bestandsbauwerke soll sowohl die oberirdischen als auch die unterirdischen Bauteile abdecken.

▪ **Ausrüstungsanlagen (OLA, LST)**

Die Ausrüstungsanlagen sind auf Basis vorliegender Bestandsdaten georeferenziert darzustellen. Die unterirdischen Bestandteile z.B. der Signale (Gründung) sind im Modell mit abzubilden.

Anforderung an die Verwendungsfähigkeit der Modelle:

- Analysen
- Auswertungen
- Berichtswesen
- 3D-Bestandsmodellierung
- Visualisierung Bestand
- Erstellung von 2D-Plänen aus 3D-Modellen

5.1.3 Anforderungen an die Modelle Vorplanung

Das Gesamtmodell muss mindestens aus folgenden Fachmodellen bestehen:

- Schienenverkehrsanlagen inkl. Unterbau, Entwässerung und Kabelführungssysteme
- Straßenverkehrsanlagen inkl. Unterbau, Entwässerung
- Ingenieurbauwerke (ein Teilmodell pro Bauwerk sowie Lärmschutzwand)
- LST-Anlagen
- Oberleitungsanlagen
- Telekommunikationsanlagen
- Elektrische Energieanlagen (50 Hz)
- Rückbaumaßnahmen (gewerkespezifische Teilmodelle)
- Leitungsverlegung (spartenspezifische Teilmodelle)

Kommentiert [A40]: Ausfüllhinweis:
Fachmodelle sind projektspezifisch auszuwählen.

- Baustelleneinrichtung
- Umweltplanung
- Baugrund
- <Text>

Die Strukturierung der Modelle muss grundsätzlich eine 1:1-Verknüpfung mit den Aktivitäten aus dem Terminplan und den Positionen aus den Kostenplänen auf übergeordneter Ebene (Bauteilgruppen) zulassen.

Die Kostenpläne und der Terminplan sind vom AN in der projektphasenspezifisch notwendigen Granularität zu entwickeln und mit dem AG abzustimmen. Für die Kostenschätzung im Rahmen der Vorplanung sind, wo vorhanden, die Inhalte des Kostenkennwertekatalogs (KKK gem. Ril 808) zu verwenden. Notwendige Ergänzungen sind durch den AN in Abstimmung mit dem AG vorzunehmen. Die Attribute der Objekte sollen Angaben über eine geografische Zuordnung, Geometrie und Mengen enthalten.

Die Objekte sind außerdem mit den erforderlichen semantischen Informationen, wie z.B. Materialangabe, Kostenkennwert, etc. zu erweitern.

Die Modelle müssen für einen modellbasierten Trassen- und Variantenvergleich eine automatisierte Auswertung der Attribute sowie der modellbasierten Mengen zulassen. Planungsvarianten sind jeweils in gleicher Struktur und Detaillierungsgrad zu modellieren, um eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Varianten herstellen zu können.

Durch die regelbasierte und eindeutige Zuweisung von Modellobjekten zu den zugehörigen Aktivitäten aus dem Bauablaufplan, anhand von Attributen, muss eine grobe Visualisierung des Bauablaufs erstellt und auf terminliche Kollisionen geprüft werden können. Dabei sollen Vorgänge des Bauablaufplans mit Modellobjekten gleicher leistungsphasenspezifischer Granularität verknüpft werden. (Siehe Abbildung 4) Das Bauablaufmodell dient zum Nachweis der Umsetzbarkeit sowie zur Bewertung und ggf. Optimierung geplanter Arbeitsabläufe und möglicher Alternativen. Mögliche Bauzwischenzustände und Bauphasen sowie ggf. bereits erforderliche Aussagen zu baubetrieblichen Einschränkungen (bspw. Sperrpausen) sind bei der Modellierung zu berücksichtigen. Der kritische Pfad muss visuell im Modell und im Bauablaufplan erkennbar sein. Außerdem sind bauleistungsrelevante Flächen im Modell zu berücksichtigen.

Anforderung an die Verwendungsfähigkeit der Modelle:

- Analysen
- Auswertungen
- Berichtswesen
- Vorplanung
- Qualitätssicherung inkl. Kollisionsprüfung
- Virtual Design Review
- Trassen- und Variantenvergleich
- Visualisierung der Varianten
- grobe Mengenermittlung
- grobe Bauablaufplanung
- grobes Sperrpausenkonzept
- Kostenschätzung
- Bestimmung der Vorzugsvariante
- Erstellung von 2D-Plänen aus 3D-Modellen

Gewerkspezifische Abweichungen (z.B. Fachmodell Umwelt) sind zu beachten.

5.1.4 Anforderungen an die Modelle Entwurfs- und Genehmigungsplanung:

Das Gesamtmodell muss mindestens aus folgenden Fachmodellen bestehen:

- Schienenverkehrsanlagen inkl. Unterbau, Entwässerung und Kabelführungssysteme
- Straßenverkehrsanlagen inkl. Unterbau, Entwässerung
- Ingenieurbauwerke (ein Teilmodell pro Bauwerk sowie Lärmschutzwand)
- LST-Anlagen

Kommentiert [A41]: Ausfüllhinweis:
Fachmodelle sind projektspezifisch auszuwählen.

- Oberleitungsanlagen
- Telekommunikationsanlagen
- Elektrische Energieanlagen (50 Hz)
- Rückbaumaßnahmen (gewerkespezifische Teilmodelle)
- Leitungsverlegung (spartenspezifische Teilmodelle)
- Baustelleneinrichtung
- Umweltplanung
- Baugrund
- <Text>

Die Strukturierung der Modelle ist auf die Termin- und Kostenplanstruktur abzustimmen, um eine 1:1-Verknüpfung mit Aktivitäten aus dem Terminplan und den Positionen aus den Kostenplänen auf Objektebene zu ermöglichen. Der Terminplan und die Kostenpläne aus der Vorplanung sind dazu vom AN weiter zu detaillieren, um eine der Projektaufgabe in dieser Leistungsphase angemessene Granularität zu erreichen. Für die Kostenberechnung im Rahmen der Entwurfsplanung sind die Inhalte der im iTWO DB hinterlegten gewerkespezifischen Kostenpläne zu verwenden. Notwendige Ergänzungen sind durch den AN, in Abstimmung mit dem AG, vorzunehmen. Die Attribute der Objekte müssen eine eindeutige geografische Zuordnung und genaue Angaben zu Geometrie und Mengen enthalten.

Für die Genehmigungsplanung sind die semantischen Modellinformationen der Modelle so zu erweitern, dass sie den Anforderungen an die Genehmigung genügen. Durch Verschneidung der Planungsmodelle mit dem Bestandsmodell Grundeigentum ist die Inanspruchnahme von Fremdgrund modellbasiert darzustellen und die betroffenen Flächen mengenmäßig, als Basis für ein Grunderwerbsverzeichnis, auszuwerten. Hierbei sind sowohl dauerhafte als auch bauzeitliche Inanspruchnahmen sowie Dienstbarkeiten zu berücksichtigen und einzeln zu ermitteln. Durch die Verschneidung der Planungsdaten (2D-dwg) mit den GIS-Daten bzw. Daten des Umweltmodells (Biotoptypen) werden Betroffenheiten flächenhaft ausgewertet, die modellbasiert dargestellt werden können. Darauf aufbauend können Maßnahmenflächen abgeleitet werden und ebenfalls modellbasiert dargestellt werden.

Durch die regelbasierte und eindeutige Zuweisung von Modellobjekten zu den zugehörigen Aktivitäten aus dem Bauablaufplan, anhand von Attributen, muss eine Visualisierung des Bauablaufs, in Form eines Bauablaufmodells, erstellt und auf terminliche Kollisionen geprüft werden können. Dabei sollen Vorgänge des Bauablaufplans mit Modellobjekten gleicher leistungsphasenspezifischer Granularität verknüpft werden. (Siehe Abbildung 4) Das Bauablaufmodell dient zum Nachweis der Umsetzbarkeit sowie zur Bewertung und ggf. Optimierung geplanter Arbeitsabläufe und möglicher Alternativen. Mögliche Bauzwischenzustände und Bauphasen sowie Aussagen zu baubetrieblichen Einschränkungen (bspw. Sperrpausen) sind bei der Modellierung zu berücksichtigen. Der kritische Pfad muss visuell im Modell und im Bauablaufplan erkennbar sein. Außerdem ist ein Bauphasekonzept darzustellen und mit Betreibern, Kommunen und Städten dokumentiert abzustimmen.

2D-Pläne (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) müssen aus den Modellen abgeleitet werden können. Die Objekte sind so genau zu detaillieren, dass die Planableitungen aus dem digitalen Bauwerksmodell den Anforderungen der Genehmigungsbehörde genügt.

Anforderung an die Verwendungsfähigkeit der Modelle:

- Analysen
- Auswertungen
- Berichtswesen
- Entwurfsplanung
- Genehmigungsplanung
- Einholen von Genehmigungen
- Qualitätssicherung inkl. Kollisionsprüfung
- Virtual Design Review
- Erstellung von 2D-Plänen aus 3D-Modellen
- Visualisierung der Planung
- Mengenermittlung
- Bauablaufplanung

- Baulogistikkonzept
- Sperrpausenkonzept
- Kostenberechnung
- Umweltplanung

5.1.5 Anforderungen an die Modelle Ausführungsplanung und Vergabe:

Das Gesamtmodell besteht aus den ausführungsfähig präzisierten Fachmodellen der Entwurfsplanung. Die Fachmodelle sind hierbei wiederum aus den bereits in der Entwurfsplanung definierten Teilmodellen zusammenzusetzen.

Für die Bauteile soll eine Objektdifferenzierung nach allen technisch trennbaren Abschnitten erfolgen. Die Trennung muss sich an den geplanten Herstellabschnitten der Bauteile gemäß Bauablaufplanung orientieren. Die Strukturierung der Modelle ist auf die Termin- und Kostenplanstruktur abzustimmen, um eine 1:1-Verknüpfung mit Aktivitäten aus dem Terminplan und den Positionen aus den Kostenplänen auf Objektebene zu ermöglichen. Die Attribute der Objekte müssen eine eindeutige geografische Zuordnung und genaue Angaben zu Geometrie und Mengen enthalten.

Die Objekte müssen außerdem mit weiteren semantischen Informationen ergänzt werden, die für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses erforderlich sind. Durch die regelbasierte und eindeutige Zuweisung von Modellobjekten zu den zugehörigen Aktivitäten aus dem Bauablaufplan, anhand von Attributen, muss eine detaillierte Visualisierung des Bauablaufs erstellt und auf terminliche Kollisionen geprüft werden können. Dabei sollen Vorgänge des Bauablaufplans mit Modellobjekten gleicher leistungsphasenspezifischer Granularität verknüpft werden. (Siehe Abbildung 4) Das Bauablaufmodell dient zum Nachweis der Umsetzbarkeit sowie zur Bewertung und ggf. Optimierung geplanter Arbeitsabläufe und möglicher Alternativen.

Mögliche Bauzwischenzustände und Bauphasen sowie Aussagen zu baubetrieblichen Einschränkungen (bspw. Sperrpausen) sind bei der Modellierung zu berücksichtigen. Der kritische Pfad muss visuell im Modell und im Bauablaufplan erkennbar sein. Außerdem ist eine Baulogistikplanung zu erstellen und im Baufortschritt dokumentiert nachzuhalten.

Durch die Verknüpfung mit den zugehörigen Positionen aus den bepreisten Leistungsverzeichnissen ist eine detaillierte Visualisierung des Kostenverlaufs zur Mittelabflussplanung zu ermöglichen.

Durch Zuordnung der Objekte zu vordefinierten Standardpositionen ist auf Basis des Modells eine Ableitung des Leistungsverzeichnisses (LV) mit vollständigen LV-Texten und LV-Mengen möglich. Die gewerkespezifischen Leistungsverzeichnisse sind vom AN auf Basis der geplanten und modellierten Anlagen in der notwendigen Granularität zu erstellen. Hierbei sind die in iTWO verfügbaren gewerkespezifischen Musterleistungsverzeichnisse als Basis zu verwenden und bei Bedarf durch weitere Leistungspositionen zu ergänzen. Für die Ergänzung sind möglichst Positionen aus dem Standard-Leistungsbuch (StLB) bzw. Standard-Leistungskatalog (StLK) zu verwenden.

2D-Pläne sind aus dem Modell abzuleiten. Die Objekte sind so genau zu detaillieren, dass bauliche und konstruktive Durchbildungen in einem angemessenen Maßstab bei Planableitung aus dem Planungsmodell ersichtlich werden.

Anforderung an die Verwendungsfähigkeit der Modelle:

- Analysen
- Auswertungen
- Berichtswesen
- Ausführungsplanung
- Qualitätssicherung inkl. Kollisionsprüfung
- Virtual Design Review
- Modellbasierte Darstellung des Bauablaufs (4D-Modell)
- Modellbasierte Darstellungen der Baukosten (5D-Modell)
- Erstellung von 2D-Plänen aus 3D-Modellen
- Visualisierung der geplanten Ausführungsvariante
- detaillierte Mengenermittlung
- detaillierte Bauablaufplanung
- detaillierte Baulogistikplanung
- detaillierte Sperrpausenplanung
- Kostenberechnung

5.1.6 Anforderungen an die Modelle Bauüberwachung und Dokumentation:

Im Unterschied zu den Modellen für die Ausführungsplanung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, wird der Detaillierungsgrad der Modelle für die Bauüberwachung und Dokumentation dahingehend erweitert, dass zusätzlich alle Informationen enthalten sind, die beschreiben, wie das Bauwerk letztendlich von der bauausführenden Firma erstellt wird. Alle Objekte sind produktkonkret zu modellieren und zu beschreiben. Das Modell soll in seinem Detaillierungsgrad dem digitalen Zwilling der zu errichtenden Anlage entsprechen.

Für die Bauteile soll eine Objektdifferenzierung nach allen technisch trennbaren Abschnitten erfolgen. Die Trennung muss sich an den tatsächlich ausgeführten Herstellabschnitten der Bauteile orientieren. Die Strukturierung der Modelle ist auf die Termin- und LV-Struktur abzustimmen, um eine 1:1-Verknüpfung mit Aktivitäten aus dem Terminplan und den Positionen aus den Leistungsverzeichnissen auf Objektebene zu ermöglichen.

Die Attribute der Objekte müssen Angaben über eine eindeutige geografische Zuordnung, präzise Geometrie und exakte Mengen enthalten.

Die Objekte sind außerdem neben den Termin und Kosten Informationen mit weiteren semantischen Informationen zu ergänzen, wie z.B. Produktbezeichnungen, Fertigungs- und Einbauinformationen, etc., welche für die Erstellung des Bauwerks erforderlich sind.

Durch die regelbasierte und eindeutige Zuweisung von Modellobjekten zu den zugehörigen Aktivitäten aus dem Bauablaufplan der ausführenden Baufirma, anhand von Attributen, muss eine Visualisierung des tatsächlichen Bauablaufs auf der Baustelle erstellt und auf terminliche Kollisionen geprüft werden können. Dabei sollen Vorgänge des Bauablaufplans mit Modellobjekten gleicher Leistungsphasenspezifischer Granularität verknüpft werden. (Siehe Abbildung 4) Das Bauablaufmodell dient zum Nachweis der Umsetzbarkeit sowie zur Bewertung und ggf. Optimierung geplanter Arbeitsabläufe und möglicher Alternativen. Der kritische Pfad muss visuell im Modell und im Bauablaufplan erkennbar sein. Mögliche Bauzwischenzustände und Bauphasen sowie Aussagen zu baubetrieblichen Einschränkungen (bspw. Sperrpausen) sind bei der Modellierung zu berücksichtigen. Außerdem ist die Baulogistikplanung nachzuverfolgen.

Die Verknüpfungen mit dem Bauablaufplan sind in einem Detaillierungsgrad vorzunehmen, dass die Modelle für aussagefähige Soll/Ist-Vergleiche herangezogen werden können.

Die Verknüpfungen mit den Leistungsverzeichnissen sind in einem Detaillierungsgrad vorzunehmen, dass die Modelle für aussagefähige Soll/Ist-Vergleiche herangezogen werden können. Außerdem muss nach der Einpflege der Ist-Werte eine Ableitung einer modellbasierten Bauabrechnung möglich sein.

2D-Pläne sind aus dem Modell abzuleiten. Die Objekte sind so genau zu detaillieren, dass bauliche und konstruktive Durchbildungen in einem angemessenen Maßstab bei Planableitung aus dem Planungsmodell ersichtlich werden.

Um eine digitale Bauakte zu erstellen, müssen die Modelle auf Objektebene eine Zuordnung von Informationen aus der Dokumentation der Bauausführung, wie z.B. Bautagebuch, Fotos, Abnahmeprotokolle, technische Datenblätter, etc. zulassen.

Um eine modellbasierte Mängelnachverfolgung durchführen zu können, müssen die Modelle auf Objektebene eine Zuordnung von festgestellten Baumängeln zulassen.

Anforderung an die Verwendungsfähigkeit der Modelle:

- Analysen
- Auswertungen
- Berichtswesen
- Ausführungsplanung
- Qualitätssicherung inkl. Kollisionsprüfung
- Virtual Design Review
- Modellbasierte Darstellung des Bauablaufs (4D-Modell)
- Modellbasierte Darstellung der Baukosten (5D-Modell)
- Erstellung von 2D-Plänen aus 3D-Modellen
- Visualisierung der geplanten Ausführungsvariante
- detaillierte Mengenermittlung
- detaillierte Bauablaufplanung

- detaillierte Baulogistikplanung
- detaillierte Sperrpausenplanung
- Kostenberechnung
- Modellbasierte Baufortschrittskontrolle
- Modellbasierte Earned-Value-Betrachtung
- Leistungsermittlung
- Modellbasierte Bauabrechnung
- digitale Bauakte

5.2 Modellstruktur und Attribuierung

Semantisches Objektmodell der DB Netz AG (Anlage Semantisches Objektmodell der DB Netz AG oder Software BIMQ)

Das semantische Objektmodell in der Version 2 (SOM) der DB Netz AG beschreibt die grundsätzlichen Anforderungen je Gewerk, die ein Auftragnehmer für BIM-Leistungen bei der Modellierung einzuhalten hat.

Das SOM wird dem AN durch den AG übergeben und ist zwingend als Basis für das projektspezifische Objekt- und Attributmodell durch den AN zu verwenden. Hierbei ist das SOM nicht als abgeschlossenes Dokument für jedes Projekt zu verstehen, sondern als Grundlage und Hilfestellung zur Erstellung der Anforderungen an ein projektspezifisches Objekt- und Attributmodell. Es können hierbei Inhalte ergänzt und nicht benötigte Inhalte entfernt werden. Die verwendeten Modell- und Attributstruktur sowie die Nomenklatur der aus dem SOM verwendeten Objekte und Attribute sowie Attributinhalt dürfen jedoch nicht verändert werden, um eine projektübergreifende Standardisierung und automatisierte Modellauswertung zu ermöglichen. Die projektspezifische Anpassung des Objekt- und Attributmodells durch den AN ist in seiner Kalkulation zu berücksichtigen. Alle zu planenden Objekte sind zu attribuieren.

Es ist eine strukturierte Sammlung fachlicher Objekte zur Planung und Realisierung von Infrastrukturmaßnahmen sowie zu den Objekten zugehörige Attribute.

6 Datenübergabe und lieferbare Leistungen

6.1 Datenübergabe durch den AG zu Leistungsbeginn

Der AG übergibt zu Beginn des Projekts dem AN ein Datenpaket, vorzugsweise über die CDE. Die Inhalte des Datenpakets werden im BAP weiter spezifiziert.

6.2 Lieferbare Leistungen durch den AN

Vom AN sind im BAP sämtliche Lieferobjekte anhand einer Lieferobjektliste näher zu beschreiben. Die Beschreibung muss hierbei für jedes Lieferobjekt mindestens folgende Inhalte haben:

- Beschreibung des Lieferobjekts
- Erstelldatum
- Datenformat
- verwendete Software
- verwendete Datenquelle

Beschreibung	Erstelldatum	Lieferintervall	Datenformat	Software	Datenquelle
BAP als freigegebenes Dokument in der V 1.0	<Text>	<Text>	DOCX, PDF	<Text>	<Text>
Fortgeschriebener BAP als freigegebenes Dok. in V. X.0	<Text>	<Text>	DOCX, PDF	<Text>	<Text>
Nutzung der gemeinsamen Datenplattform für die Dauer der Projektdurchführung	-	<Text>	-	<Text>	<Text>
Fachmodelle	<Text>	<Text>	IFC RVT, SMC, CPA, NWD, CPIXML, SHP, geoJSON, DWG, GDB	<Text>	<Text>
Koordinationsmodell	<Text>	<Text>	CPA, NWD, IFC, CPIXML	<Text>	<Text>
Gesamtmodell	<Text>	<Text>	CPA, NWD, IFC, CPIXML	<Text>	<Text>
Modellbasierte Kostenplanung	<Text>	<Text>	RPZ, GAEB	<Text>	<Text>
Modellbasierte LV-Erstellung	<Text>	<Text>	RPZ, GAEB	<Text>	<Text>
Visualisierung	<Text>	<Text>	RVT, 3D DWG, PLN, DGN, COLLADA, CityGML	<Text>	<Text>
As-built-Modell	<Text>	<Text>	SMC, CPA, NWD, IFC, CPIXML	<Text>	<Text>
<Text>	<Text>	<Text>	<Text>	<Text>	<Text>

Tabelle 5: Bsp. Lieferbare Leistungen durch AN

Anlagen

Anlage semantisches Objektmodell (Excelliste, Stand Februar, 2023)
